

Feliz

Año Nuevo

# Balance de Afectación



## PERSONAS

Heridos	<b>398</b>
Fallecidos*	<b>333</b>
Cuerpos Entregados a las Familias	<b>300</b>
Desaparecidos	<b>76</b>
Familias Registradas en el RUD	<b>7.794</b>
Personas Registradas en el RUD	<b>22.310</b>

## INFRAESTRUCTURA

Barrios Afectados	<b>48</b>
Subestación Eléctrica	<b>1</b>
Acueductos	<b>2</b>
Red de Gas	<b>1</b>
Kilómetros de Vías	<b>11.58</b>
Puentes Destruídos	<b>2</b>
Puentes Averíados	<b>3</b>
Viviendas Afectadas	<b>1.462</b>
Hectáreas Rurales	<b>486,3</b>



MINDEFENSA



NGRD  
Unidad Nacional para la Gestión del  
Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres



# FASE DE RESPUESTA

100%



## ASISTENCIA HUMANITARIA

**2,540** Ton entregadas  
**59** Barrios Beneficiados  
**22,267** Personas Beneficiadas  
**297** Apoyos Exequiales

## SALUD

**57,945** Vacunas Entregadas  
**1,639** Vacunas Aplicadas a Animales  
**25,392** Personas Beneficiadas  
**4,386** Personas Con apoyo Psicosocial.



## PUESTO DE MANDO UNIFICADO

**95** Reuniones Realizadas  
**+2,300** Miembros del SNGRD estuvieron en operación.  
**10,000** Atendidas en puesto de información

## SERVICIOS PUBLICOS

**100%** Energía  
**100%** Acueducto  
**100%** Comunicaciones  
**100%** Gas  
**100%** Alcantarillado







## SUBSIDIOS DE ARRIENDO

**5,648** Subsidios Entregados  
**10,200** Millones Invertidos  
**4,448** Familias Beneficiadas

## AGUA Y SANEAMIENTO

**40** Carrotanques estuvieron operando  
**102** Millones de Lts de Agua Entregados  
**47,600** Personas Beneficiadas



## EDUCACIÓN

**57** Sedes Educativas Habilitadas  
**8** Aulas Móviles Instaladas  
**14,500** Kits Escolares Entregados  
**61** Jornadas Socioculturales

## ALBERGUES TEMPORALES

**4,844** Personas Estuvieron en Albergues  
**9** Albergues fueron activados  
**765** Familias Trasladas a otras Ciudades.





# FASE DE ESTABILIZACIÓN

100%



## MAQUINARIA AMARILLA

**208** Maquinas Fueron utilizadas  
**49,220** Horas Maquina  
**14,560** MI de Ríos Dragados  
**3** Vías Nacionales Habilitadas

## OTROS

**47** Ton de Suplemento Alimenticio para Niños Distribuidas.

**01** Mapa de Zonificación Elaborado.

**01** Decreto de Exención de IVA

**01** SAT Comunitario Instalado



# FASE DE ESTABILIZACIÓN

Avance  
**100%**








# FASE DE RECONSTRUCCIÓN

## AVANCE DE TEMAS EN EJECUCIÓN

### ADMINISTRACIÓN MOCOCHA

**100%**



- 100% Adecuación
- 40 puestos de trabajo instalados
- Pago de Arrendamiento al día
- 100% Internet
- 100% Puesta en funcionamiento Bodega
- 100% Contrato de aseo y cafetería OGN

### DOTACIÓN DE UNIFORMES

**100%**



- 5,036 Uniformes a entregar
- 2,518 Niños y Niñas beneficiados
- 100% de avance en la ejecución
- 100% del Suministro en proceso de pago
- 100% Pagado

### PUENTES PEATONALES

**EN PROCESO**



- 100% de Construcción puente Mulato
- 100% construcción Puente Dantayaco
- 100% construcción Puente Villa Rosa
- Pendiente Instalación 4 Puente (San Agustín)

### SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA SAT

**100%**



- 100 % de avance en la ejecución
- 01 Puesto de monitoreo instalado
- 12 Sirenas instaladas
- 11 Sensores de rio instalados
- 4 Estaciones Meteorológicas Instaladas
- 75% Avance Estudio con U. Javeriana

## SISTEMA DE ALERTA COMUNITARIO

93%



- 10 Personas haciendo monitoreo y en comunicaciones.
- 48 Planes comunitarios **Formulados**
- 27,800 habitantes a ser beneficiados con los Planes Comunitarios.
- En socialización Planes Comunitarios



## MAQUINARIA AMARILLA ETAPA II

100%



- 2,422 Horas maquina contratadas
- 2,422 Horas trabajadas.
- 03 Maquinas en Operación UNGRD, trabajos de Demolición de Viviendas con daño severo.
- 53 viviendas demolidas

## PAVIMENTACIÓN DE VÍAS

EN PROCESO



- 2,8 Km de vías a ser pavimentadas
- 01 Convenio Marco Firmado
- 01 Convenio Derivado firmado Ejercito-UNGRD-Municipio.
- 02 Vía Pavimentada 246 ML. (Ejecutando Obras de Arte)
- 05 Vías en ejecución.
- **8,6% Avance en la pavimentación**

## MEJORAMIENTO CANCHA EL PEPINO Y SALÓN COMUNAL

95%



- 3 Meses de tiempo de ejecución
- **Actividades a desarrollar:** (Filtros, Nivelación terreno, Rehabilitación salón social y construcción de 01 parque infantil).
- 3,700 Personas beneficiadas.
- 95% avance de actividades.
- En adecuación del salón comunal y terminación de engramado.

## SUBSIDIOS DE ARRIENDO Y AHE ALIMENTARIA

EN PROCESO




- 7.175 Contratos de Arriendo Suscritos a la fecha
- 1.485 Subsidios Prorrogados por **Primera vez**
- 1.186 Subsidios a la fecha en la **Segunda Prorroga**
- 1) En el mes de octubre de 2017: **1218 kits**
- 2) En el mes de noviembre 2017: **1060 kits**
- 3) En el mes de diciembre 2017: **972 Kits**

**TOTAL AHE**  
**3585 KITS**



## FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

100%

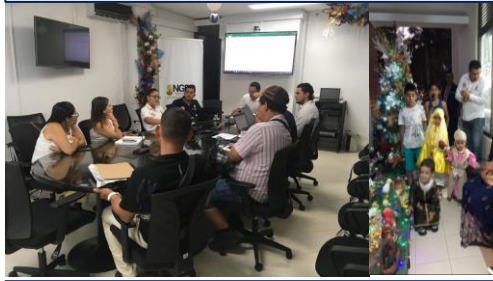

- 12 Profesionales contratados como apoyo al CMGRD.
- 01 Secretaria de Gestión del Riesgo creada y con apoyo técnico.
- 1 Personas de apoyo contratadas (Conductores)
- 100% de capacidad instalada de profesionales como apoyo al proceso de reconstrucción

## PLAZA DE MERCADO DEFINITIVA

EN PROCESO



- 01 de lote propuesto por la Alcaldía
- 01 Declaratoria de utilidad pública del predio
- 01 Resolución de Expropiación Notificada
- 02 Hectáreas a adquirir
- 8,100 Millones a Invertir (2,100 UNGRD; 6.000 DPS)
- Se realizo Acta Posesión del Predio-
- Se realiza Inscripción del Acta en la Ofi. De Instrumentos Públicos



## ADECUACIÓN COLEGIO CIUDAD MOCOA

EN PROCESO



- 01 Convenio Marco Firmado UNGRD- COLEGIO
- 01 Contrato de ejecución **formalizado**
- 18 Dic Inició Ejecución de Obra
- 2% Avance en la adecuación.
- 100% Donación CARACOL TV (YO ME LLAMO)
- 231 Millones a invertir

## VIVIENDA LOS SAUCES ETAPA I


EN PROCESO



- 100% Ejecución del cambio de red de acueducto
- 99% Avance en estudios y diseños
- 80% Avance en preparación del terreno.
- 15,3% de Obra ejecutada
- Se avanza **PRIMER NIVEL**, Manzana (E), con levantamiento de paredes de segundo piso.

## VIVIENDAS RURALES

EN PROCESO

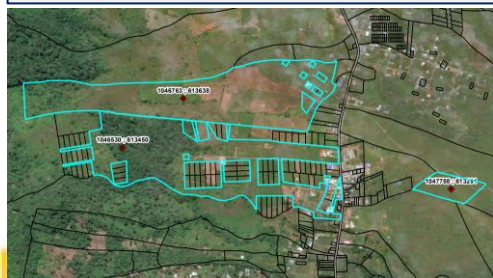

- 345 Viviendas a construir
- 100% de Recursos aprobados por Min-agricultura.
- 01 Decreto modificación de densidades expedido.
- 03 Predios de un mismo propietario en la vereda Planadas
- En proceso de avalúo por parte del IGAC.
- 26 Hectáreas a Adquirir.

## BANCO DE MAQUINARIA

**EN PROCESO**

- 100% Maquinaria definida por la Alcaldía.
- 7 Equipos a ser adquiridos (1 Bulldozer, 2 Carro-tanques, 1 Retroexcavadora, 1 Motoniveladora, 1 Vibro-compactador, 1 Vactor.)
- Pendiente asignación recursos INVIAS (4'000.000.000,00).
- Se proyecta adquisición Inicial Equipos Recursos UNGRD.

## ACTIVACIÓN AGROPECUARIA

**EN PROCESO**

- 01 Plan de asistencia técnica Municipal en ejecución
- 01 Convenio firmado por: **FNGRD-MINAGRICULTURA Y MUNICIPIO DE MOCOA.**
- 1,000 millones destinados para apoyar a los campesinos afectados por el evento natural.
- 180 familias campesinas a ser beneficiadas
- En proceso de Giro de Recursos de MADR a FNGRD

## INFRAESTRUCTURA VIAL (PUENTE MULATO)

**EN PROCESO**

- 4 Puentes vehiculares proyectados (Quebrada San Antonio, Av. Colombia, Terminal y Mulato)
- Inicia obra de construcción de puente Mulato
- 03 Puentes de responsabilidad INVIAS:
  - R. Sangoyaco-Av. Colombia. **Sin recursos.**
  - R. Sangoyaco- Terminal. **Sin Recursos**
- 01 Puento de responsabilidad ANI- Fase Estudios-Diseños- **Inicia Obra Febrero 2018**



## AGUA Y SANEAMIENTO

**EN PROCESO**

- 2,5% Avance en obra, estudios y diseños
- 01 Contrato en ejecución.
- 28,000 Millones a ser invertidos
- En consulta previa con comunidad Indígena.
- Tienen avances en obra, líneas de conexión 1,085 ml

## TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC

**EN PROCESO**

- 3,000 Millones a ser invertidos
- 03 Licencias a emisoras comunitarias entregadas
- 2,500 Decodificadores de TDT entregados
- 200 Becas de talento de TIC a ser entregadas
- 01 Punto Vive digital a ser instalado.
- 4500 computadores para educar, entregados a 37 Colegios
- 06 Zonas WIFI, entregados



## INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

EN PROCESO



- 2 Colegios a ser construidos.
- 24 Aulas a ser construidas
- 9 Instituciones Educativas van a ser mejoradas.
- 1 Casa Lúdica se va a construir
- 1 Biblioteca a ser construida
- 1 Centro de Desarrollo Infantil va a ser construido

## REUBICACIÓN SUBESTACIÓN ELECTRICA

EN PROCESO

- 45,000 Millones van a ser invertidos en este proyecto
- 01 Predio definido en proceso de adquisición.
- 6 Meses de subsidios a damnificados
- En Replanteo e Ingeniería de restablecimiento Fase II.
- Limpieza de: equipos, Carcamos, Sala de Control.
- Instalación de tableros de control y protecciones

## PROYECTOS COMUNES SAUCES I

EN PROCESO

CDI

- 4,300 Millones van a ser invertidos en este proyecto
- 300 Niños de Capacidad
- 02 de Octubre se adjudicó el contrato al constructor
- 13 de Octubre se adjudicó el contrato a la Interventoría

- 600 Millones van a ser invertidos en este proyecto
- En estudios de Suelo
- Responsables: Mincultura y Embajada de Japón.
- 100% Labores de adecuación de terreno y cerramiento.
- 21% Avance en la construcción

CASA LÚDICA

- 600 Millones van a ser invertidos en este proyecto
- En estudios y Diseños
- Responsables: Cancillería.



**Construcción de Viviendas**



**Avance Construcción Biblioteca**

**Inauguración vía Victoria Regia**



**Adecuación Salón Comunal el Pepino**

Bocatoma Las Palmeras		VARIABLES METEOROLÓGICAS	
Intensidad de Huvia: 3.7 mm/h	Temperatura Ambiente: 18.9 °C	Presión Atmosférica: 1008.1 mbar	Porcentaje Humedad: 93.4 %
Intensidad de Huvia: 3.7 mm/h	Temperatura Ambiente: 18.9 °C	Presión Atmosférica: 1008.1 mbar	Porcentaje Humedad: 93.4 %
Intensidad de Huvia: 3.7 mm/h	Temperatura Ambiente: 18.9 °C	Presión Atmosférica: 1008.1 mbar	Porcentaje Humedad: 93.4 %



**Ciudad Mocoa**

## ACTIVIDADES DE LA SEMANA

1. Se realiza reunión entre representantes del Cabildo Inga Mocoa y Gobierno Nacional para tratar temas de obras del Plan Maestro de Acueducto.
2. En desarrollo obras de Arte en vías Pablo VI.
3. Se realiza seguimiento a cada una de las obras en ejecución, Pepino, Sauces, Vías, Acueducto, Demoliciones, Biblioteca, SAT.
4. Se finaliza la formulación de los Planes Comunitarios y se continua con ajustes y socialización a la comunidad.
5. Se realiza adelanta estudios previos e invitación a cotizar de proceso de compra de repuestos para maquinaria para pavimentación de vías.
6. Se hacen visitas de verificación de familias que ocupan viviendas afectadas y se encuentran recibiendo subsidios de arriendo y se Socializa con el CMGRD.
7. Se recopilan y envían documentos al IGAC para avalúo de predios rurales.
8. Se realiza acompañamiento a perito evaluador del IGAC a predios rurales.
9. Se continua proceso de adquisición del predio para Sauces II.
10. Se continúan labores en construcción del Puente sobre el Rio Mulato.
11. Se realiza apoyo constante a las necesidades del Municipio y la Gobernación.
12. Se realiza intervención en la vía al Batallón de obras de Acueducto.
13. Se realiza el apoyo y tramite para la contratación de los Maestros de Obra para el proyecto de pavimentación.
