

AVANCE PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO

RECONSTRUCCIÓN MOCOCHA

16 DE ENERO DE 2018



MINDEFENSA



EVENTO QUE SE PRESENTÓ

Avenida Torrencial ocasionada por el aumento de los niveles de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato, en el municipio de Mocoa.

MARCO LEGAL

- Decreto de Desastre para el Municipio de Mocoa No. 599, expedido por el señor Presidente.
- Decreto de Estado Emergencia Económica, Social y Ecológica No. 601, expedido por el señor Presidente.
- Decreto de Calamidad Pública Departamental No. 068 expedido por la Gobernadora
- Decreto de Calamidad Pública Municipal No. 056, expedido por el Alcalde



Puesto de Mando Unificado

PERSONAS

Heridos	398
Fallecidos*	333
Cuerpos Entregados a las Familias	300
Desaparecidos	76
Familias Registradas en el RUD	7.794
Personas Registradas en el RUD	22.310

INFRAESTRUCTURA

Barrios Afectados	48
Subestación Eléctrica	1
Acueductos	2
Red de Gas	1
Kilómetros de Vías	11.58
Puentes Destruídos	2
Puentes Averiados	3
Viviendas Afectadas	1.461
Hectáreas Rurales	486,3

ACTIVACIÓN INMEDIATA

Activación del Protocolo de Respuesta del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en cabeza del señor Presidente de la República.

PUESTO DE MANDO UNIFICADO

Activación del Puesto de Mando Unificado en menos de 8 horas **120 Reuniones Realizadas**

Miembros del SNGRD que operaron **Más de 2.300**

Personas Atendidas en los Puesto de Información **Más de 10.000**

ASISTENCIA HUMANITARIA

AHE Alimentaria y No Alimentaria (Mercados, Kits de Aseo, Frazadas, Colchonetas, Kits de Cocina) **2.540 Toneladas Entregadas**

Incluidas las Donaciones de la Primera Dama, Empresas Privadas y Comunidad

APOYO EXEQUIAL

Apoyos Exequiales entregados **297 Fallecidos**

FASE DE RESPUESTA

100%

EN 18 DÍAS DE OPERACIÓN



SALUD

Dosis de Vacunas Aplicadas (Tétano, Hepatitis A y Varicela) **57.945**

Vacunas Aplicadas Animales **1.639**

ENERGÍA

Energía habilitada el día 11 con una subestación provisional **100%**

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Restablecimiento de Telefonía y datos **100%**



Asistencia Humanitaria de Emergencia

AGUA Y SANEAMIENTO

Litros de Agua Entregados

Más de 88 millones

Litros de Agua Entregados por Día

1 millón

Se utilizaron más de **40 Carrotanques** en la operación, Plantas Potabilizadoras, Motobombas y Tanques de Almacenamiento.

Hoy 3 Carrotanques se encuentran disponibles

ALBERGUES TEMPORALES

Personas que estuvieron en los Albergues

4.561

Albergues que fueron Habilitados y Administrados

9

SUBSIDIOS DE ARRIENDO

Subsidios de Arriendo Entregados

4.448

**Valor Subsidios: \$10.200 millones
Hasta junio de 2018**

FASE DE ESTABILIZACIÓN

100%

90 días



Familias Albergue el Pepino

Transporte y traslados

Personas que fueron trasladadas a otras ciudades con el apoyo de Cancillería y OIM

765

MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPO

Equipos de Maquinaria Amarilla que fueron utilizados en la operación **208**

Se utilizaron 51.642 Horas Máquina para la rehabilitación de vías, remoción de escombros, limpieza de calles y colegios, dragados y reconfiguración de cauce de los ríos y quebradas.

INFRAESTRUCTURA

Puentes Vehiculares habilitados (1 Puente Militar) **4**

Vías Nacionales Habilitadas **3**

AGUA

Bocatomas en Rehabilitación **4**

Zona con Disponibilidad de Agua Potable terminada (Suroccidente) **1**

Zonas con Disponibilidad de Agua Cruda (Centro, Barrios Unidos y Norte) **3**

Suministro de materiales-UNGRD, Soporte Técnico-
MinVivienda, Logística- Ejército Nacional

COMERCIO

Comerciantes Caracterizados **354**

Exención del IVA

EDUCACIÓN

Sedes Educativas Habilitadas **57**

Aulas Móviles Instaladas **8**

Kits Escolares Entregados **14 mil**



CULTURA

Libros y lámparas entregadas a niños **2.056**

Jornadas Socioculturales **61**

AMBIENTE

Elaboración del Mapa de Zonificación
de Riesgo (Mesa Técnica de Ambiente) **1**

EMPLEO Y CAPACITACIÓN

Empleos Generados: (Remoción de
Escombros, Manejo de Maquinaria,) **270**

NIÑEZ

Suplemento Alimenticio para Niños y
Madres Gestantes **47
Toneladas
entregadas**

CONTINUAMOS EN ...

- Subsidio de Arriendo para propietarios de vivienda destruida.
- Suministro de Agua en Carrotanques.
- Fortalecimiento Institucional del Consejo Departamental y Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.

**INSTALACIÓN DE LA
OFICINA DEL
GOBIERNO NACIONAL
PERMANENTE EN
MOCOA - OGN**

Valor Donaciones en Efectivo - UNGRD

Cuenta Davivienda No. **021666888**

Donaciones Nacionales	\$ 10.089.155.785
Donaciones Países, Gobiernos y personas en el exterior	\$ 27.239.109.617
TOTAL	\$ 37.328.265.402

CHINA	\$ 2.854.900.000
EMIRATOS ARABES	\$ 19.690.929.675
TURQUÍA	\$ 430.250.000
BANCO CENTROAMERICANO	\$ 718.375.000
BID	\$ 569.200.000
CAF	\$ 285.765.000
KEYCOFFEE	\$ 26.378.087
MITSUBISHI	\$ 131.890.436
KEIMYUNG CARITAS (SOUTH KOREA)	\$ 12.840.994
DINAMARCA	\$ 130.434.782
USA PEEC	\$ 72.566.250
CARING FOR COLOMBIA	\$ 122.793.200
USTOA	\$ 14.820.000

BOOYOUNG HOUSING CO LTD (SOUTH KOREA)	\$ 294.796.029
LIG NEX1 CO.,LTD.	\$ 59.340.000
TAILANDIA	\$ 292.820.000
GIFU BROADCASTING	\$ 2.641.578
COREA	\$ 871.950.000
WORLD TRADE ORGANIZATION	\$ 9.460.391
HYUNDAI	\$ 293.170.000
COLOMBIANOS EN ALEMANIA	\$ 8.071.446
PERSONAS EN EL EXTERIOR	\$ 172.350.083
GIVE TO COLOMBIA	\$ 173.366.667

Asignación o Compromiso de Recursos

Uniformes estudiantes de Mocoa*	\$	727,593,000
Construcción Colegio de 24 aulas en Sauces II	\$	8,500,000,000
Adquisición del predio para la Fase I de construcción de vivienda Rural	\$	1,907,820,000
Escrituración del Predio Sauces*	\$	9,637,000
Adquisición del predio para la Fase II de construcción de vivienda Rural*	\$	1,185,665,880
Estudios y diseños técnicos para la construcción de la vivienda de interés prioritario (Interventoría) *	\$	1,455,032,040
Asistencia Humanitaria de Emergencia*	\$	569,200,000
Adecuaciones accesos y servicios públicos predio Plaza de Mercado Definitiva*	\$	1,700,000,000
Adquisición de predio para la Plaza de Mercado Definitiva*	\$	400,000,000
Pavimentación de vías urbanas *	\$	5,000,000,000
Mejoramiento de instalaciones Educativas e instalación de equipos *	\$	290,000,000
Laboratorio de ciencia y dotación de la banda de paz del Colegio Ciudad Mocoa	\$	122.793.200
Dotación del Centro de Desarrollo Infantil	\$	173.366.667
TOTAL ASIGNADO	\$	22.041.107.787
POR ASIGNAR	\$	15.287.157.615

- *Estos valores cambian de acuerdo al estudio de mercado y uso de suelo.*
- *Este cuadro es un control interno de seguimiento, los valores pueden variar.*

DONANTE	DESCRIPCIÓN
Amerisur	Contenedor nevera para conservación de cadáveres
Telefónica-Movistar	15 teléfonos Nokia 3500 Negros
Bettina Spitz	7 cajas con prendas de vestir femeninas
DICORP	5 Toneladas de arroz, 582 litros de aceite de palma
Shelterbox	63-Cajas Shelterbox
Global Medic	Mapas e Imágenes de drones de alta precisión
Asecones	10 equipos portátiles de comunicación de dos vías Digital
Gobierno de Japón	30 Generadores eléctricos de 60 Hz
Eduardoño	1 planta eléctrica
Gobierno de Turquía	Medicamentos, 200 kits de aseo básico, 100 lámparas solares
Skinco Gyplac	3 kits de almacenamiento Acuaviva de 6.000L
Terpel	600 galones de ACPM para vehículos y plantas eléctricas
Fundación Éxito	Viveres para Asistencia Humanitaria
Colempaques	421 Tanques de Almacenamiento de Agua 126 canecas plásticas para las viviendas



Donación Colempaques

TOTAL DONACIONES EN ESPECIE
\$668 Millones

SECTOR
VIVIENDA



1.461

TOTAL VIVIENDAS A CONSTRUIR

1.209 Viviendas Urbanas
252 Viviendas Rurales



VIVIENDA URBANA

• Fase 1: En Construcción 300 viviendas (Los Sauces I)

\$ 22.260 millones

- ✓ Área de cada vivienda: 64 m²
- ✓ 3 hectáreas predio Sauces I

AVANCE

- ✓ 99% de los estudios y diseños (9 de 10 lotes)
- ✓ 100% en el cambio de la red de acueducto
- ✓ 80% en preparación del terreno
- ✓ 15.8% de ejecución física
- ✓ Avance en Muros segundo nivel en las manzanas E y D.
- ✓ Formulación Plan de Contingencia para garantizar el cumplimiento del cronograma de la ejecución del proyecto y la entrega de viviendas.



Avance de construcción Fase I Vivienda Urbana – Los Sauces I



Tiempo de ejecución: 1 año - (mayo 2017- mayo 2018)

COMPROMISOS...

- Primeras 100 viviendas para febrero 2018.
- Postulación de las familias.
- Servicios públicos del Predio.
- Fecha de finalización 11 de mayo: 300 casas

VIVIENDA URBANA

• Fase 2:

**Construcción 909 viviendas
(Sauces II) \$60.448 millones**

Predio Sauces II.

- ✓ **Área del predio:** 16.93 Hectáreas

AVANCE

- ✓ Se realizó el proceso de toma de posesión del Predio y registro del acta en instrumentos públicos.
- ✓ Asignación de los recursos para la ejecución de las 909 viviendas.
- ✓ Otro sí perfeccionado
- ✓ Se remitieron invitaciones para cotizar para la ejecución de la obra, plazo máximo de remisión de propuestas 15 de enero de 2018.

**Tiempo de
ejecución:**

**1 año y seis meses –
(Diciembre 2017-junio 2019)**




COMPROMISOS...

- Respuesta a recursos de reposición.
- Registro del predio a nombre del FNGRD
- Primeras 300 casas para agosto 2018
- Definición de Diseños

1. Centro Regional de Atención a Víctimas
 Unidad de Víctimas

2. Colegio Saucés II
 MinEducación-UNGRD
 Estructuración de obra e interventoría Junio 2019.

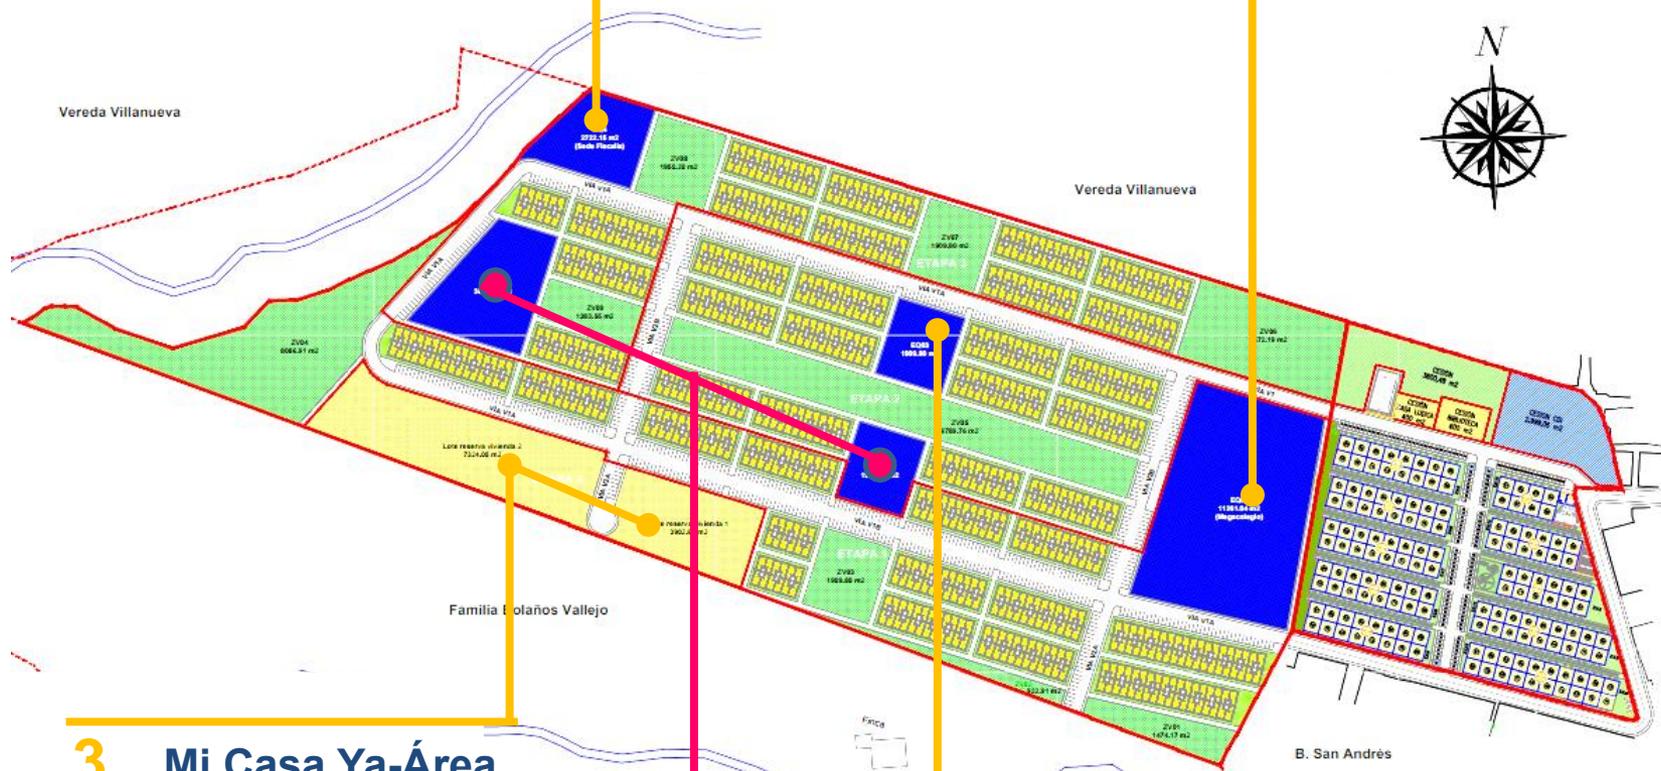

3. Mi Casa Ya-Área Disponible
 MinVivienda

Espacios Disponibles

4. Centro de Integración Ciudadana
 MinInterior
 • Aporte de recursos
 • Revisión de insumos técnicos

ACUEDUCTO

AVANCE

- **Construcción del Sistema de Acueducto- Viceministerio de Agua**

\$28.074 millones

- ✓ El 8 de noviembre se dio inicio a las obras de redes de distribución, de acuerdo con la reprogramación realizada. Se tiene un avance de 3.222 metros tubería PVC D=3,4,6" en las zonas 1,2 y 4 del casco urbano.
- ✓ El 13 de diciembre el contratista inicio trabajos preliminares en la Bocatoma y Desarenador.
- ✓ El Resguardo Indígena INGA expidió Resolución 001 del 05 de enero de 2018, mediante la cual se aprueba realizar las obras preliminares de descapote, limpieza, cerramiento lona, excavaciones, cargue y retiro de las obras tanque 1 Planta de tratamientos y tratamiento lodos del proyecto reconstrucción del sistema de acueducto dentro del resguardo.
- ✓ En proceso Consulta Previa, se tiene prevista la culminación del proyecto en un plazo de 8 meses.
- ✓ Avance en 5.400 ml líneas de conexión.
- ✓ 2% avanece en obras, estudios y diseños.

COMPROMISOS...

- Proyección obras preliminares en Bocatoma

ALCANTARILLADO

- **Plan Maestro de Alcantarillado**

\$91.200 millones

- ### AVANCE
- ✓ Operación aprobada en Comisión Interparlamentaria el 6 de diciembre.
 - ✓ Aprobación en el Directorio del BID el 13 de diciembre.
 - ✓ Diseños entregados para la vigencia 2018, y ejecución para el 2019 y 2020

COMPROMISOS...

- CREDITO BID: Operación aprobada, en revisión minuta del Préstamo.

CRONOGRAMA

COMPONENTE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	CONSULTA PREVIA		OBSERVACIONES
			SI	NO	
BOCATOMA	13/12/2017	12/03/2018		X	DISEÑOS APROBADOS POR INTERVENTOÍA Y AVALADOS POR FINDETER EL 13 DE DICIEMBRE DE 2017. EN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRELIMINARES
LINEA DE ADUCCIÓN	22/12/2017	06/02/2018		X	DISEÑOS HIDRAULICOS APROBADOS. SE RERQUIEREN RECURSOS ADICIONALES PARA ESTUDIOS DE SUELOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS DEFINITIVOS
DESARENADOR	03/12/2017	17/01/2018		X	SE ADELANTAN ACTIVIDADES PRELIMINARES (LOCALIZACIÓN - REPLANTEO; CAMPAMENTO)
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA	18/01/2017	17/03/2018	X		DISEÑOS HIDRAULICOS APROBADOS. SE ENCUENTRAN APROXIMADAMENTE 800 m EN EL TERRITORIO DEL RESGUARDO INGA. SE REQUIEREN RECURSOS ADICIONALES PARA ESTUDIOS DE SUELOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS DEFINITIVOS
PTAP	22/12/2017	22/05/2018	X		DISEÑOS APROBADOS. SU IMPLANTACIÓN SE ENCUENTRA EN ZONA DEL RESGUARDO INGA
ESTRUCTURA DE LODOS	22/12/2017	21/02/2018	X		
LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA	09/12/2017	26/06/2018		X	DISEÑOS HIDRAULICOS APROBADOS. PARA LAS LINEAS SUROCCIDENTE Y NORTE, SE REQUIEREN RECURSOS ADICIONALES PARA ESTUDIOS DE SUELOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS DEFINITIVOS.
TANQUE No. 1 V= 927 m3	22/12/2017	22/05/2018	X		DISEÑOS APROBADOS. SU IMPLANTACIÓN SE ENCUENTRA EN ZONA DEL RESGUARDO INGA
TANQUE No. 2 V= 1.533 m3	28/12/2017	28/06/2018		X	DISEÑOS HIDRAULICOS APROBADOS. SE REQUIEREN RECURSOS ADICIONALES PARA ESTUDIOS DE SUELOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS DEFINITIVOS.
REDES DE DISTRIBUCIÓN	09/11/2017	20/04/2018		X	EN EJECUCIÓN DE OBRAS. SE HAN EJECUTADO APROXIMADAMENTE 3.720 m DE TUBERÍA PVC 2,3,4 Y 6"

• Construcción Centro de Desarrollo Infantil barrio los Sauces I - MinVivienda

\$ 3.500 millones

AVANCE

- ✓ Capacidad de 300 niños
- ✓ Adjudicación contrato de obra y de interventoría
- ✓ Se adelantaron los estudios y diseños.
- ✓ Se realizó la topografía.
- ✓ Se celebró un taller participativo el 20 de diciembre de 2017
- ✓ El 15 de enero se presentarán los diseños para su aprobación
- ✓ Se realizará la dotación con la Donación de Give To Colombia.

Fecha terminación:

Julio 2018

COMPROMISOS...

- **Minvivienda:** Entregar cronograma.



SECTOR
AGRICULTURA

• Construcción 252 viviendas

AVANCE

- ✓ Identificación de 252 familias beneficiarias
- ✓ Aprobación de recursos 100% de Min- Agricultura
- ✓ La Alcaldía definió nuevo predio en la vereda Planadas de 26 hectáreas, para la totalidad del proyecto.
- ✓ Decreto de modificación de densidades expedido
- ✓ IGAC realizó visita al predio para levantamiento topográfico.

Tiempo de ejecución:

1 año y 5 meses

Firma Convenio: 10 de Octubre 2017

Fecha proyectada para terminar: Marzo de 2019

\$16.390 millones



Vereda Planadas - Predio La Cabaña.



COMPROMISOS...

- **IGAC:** Entrega avalúo catastral
- Revisar servicios públicos (agua y energía)
- Desembolso de los recursos del Banco Agrario a la UNGRD.
- Adquisición del Predio por parte de la UNGRD en el mes de enero 2018

VIVIENDA RURAL

AVANCE

- **Mejoramiento de 350 viviendas –MinAgricultura**
\$ 6.220 millones

- ✓ La Alcaldía remitió listado de potenciales familias .

COMPROMISO...

- ✓ Se presentará en la próxima comisión de vivienda para la distribución de los recursos correspondientes para la vigencia 2018: «*Programas Estratégicos Bolsa Nacional – Agencia Nacional de Desarrollo Rural*».

ACTIVACIÓN SECTOR AGROPECUARIO

- **Reactivación Económica para 180 familias- Alcaldía y MinAgricultura**

\$1.020 millones

AVANCE

- ✓ Definición de las **180 familias** a ser beneficiadas entre la Alcaldía y el Ministerio de Agricultura.
- ✓ Se presentó el Plan Operativo en comité de supervisión.
- ✓ Convenio perfeccionado entre MinAgricultura y la UNGRD

COMPROMISOS...

- Desembolso del Ministerio a la UNGRD.

Tiempo de ejecución:

6 meses
(noviembre 2017 a mayo de 2018)

SECTOR
PROSPERIDAD SOCIAL

VIVIENDA URBANA

AVANCE

- ✓ Convenio con operador UNOPS
- ✓ Identificadas 220 viviendas por la Alcaldía

- ✓ **1ra Etapa-120 viviendas: (3.5 meses)**
 - Aprobación del comité de estructuración: 20 de noviembre de 2017.
 - Socialización con la comunidad del proyecto el 21 de diciembre de 2017
 - Inicio de Obra: 1 de diciembre 2017 (25 viviendas en 20 días).

- ✓ **2da Etapa-100 viviendas: (3 meses)**
 - Pendiente aprobación del comité de estructuración: 15 de diciembre de 2017.
 - Socialización con la comunidad del proyecto el 21 de diciembre de 2017
 - Inicio de Obra: 15 de diciembre 2017

- ✓ **3da Etapa-80 viviendas: (2.5 meses)**
 - Pendiente aprobación del comité de estructuración: Por definir
 - Socialización con la comunidad : Por definir
 - Inicio de Obra: Por definir

- **Mejoramiento de 300 viviendas
Prosperidad Social**

\$4.972 millones

Tiempo de ejecución: 9 meses - (27 noviembre 2017 a Agosto 2018)

COMPROMISOS...

- Desembolso del Ministerio a la UNGRD.
- **1ra Etapa**- Socialización con la comunidad del proyecto en enero de 2018 y ubicar a las familias.
- **2da Etapa** - Socialización con la comunidad del proyecto en febrero 2018.
- **Alcaldía:** Certificaciones de condiciones Viviendas para ejecución 2da etapa.

• Construcción plaza de mercado \$8.100 millones

AVANCE

- ✓ **FASE 1 (UNGRD) - \$ 2.000 millones**
 - **Componente 1: (\$400 millones)**
 - Se realizó la posesión del predio.
 - Se realizó inscripción del Acta de Posesión en la oficina de Instrumentos Públicos.
 - **Componente 2: (\$1.700 millones)**
 - Estudios y diseños
 - Obras de adecuación de acceso
 - Obras de conexiones a servicios públicos
 - 2 hectáreas a adquirir
- ✓ **FASE 2 (Prosperidad Social) - \$ 6.000 millones**
 - Construcción (**\$6.000 millones**)
 - Se suscribió el Convenio entre Prosperidad Social y la UNGRD-14 diciembre 2017.



Tiempo de ejecución:

2 años y 5 meses -
(diciembre 2017 a marzo de 2020)

COMPROMISOS...

- Respuesta a recursos de reposición
- Elaboración Plan Operativo
- Planta de tratamiento de aguas residuales
- Determinación fuente de financiación etapa de estudios y diseños, revisión estructuración convenio con la Universidad Nacional.
- **UNGRD:** Contratación para ejecución de las obras
- **Alcaldía:** Listado de comerciantes beneficiados

SECTOR
EDUCACIÓN

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

- **Construcción y mejoramiento de sedes educativas**

\$29.000 millones

AVANCE

- **Construcción del colegio ubicado en el predio los Sauces II - UNGRD, con apoyo MinEducación.**

- ✓ Se firmo el convenio entre el MinEducación y la UNGRD.
- ✓ Se beneficia a mas de 3.000 niños.

Tiempo de Ejecución: 16 meses (noviembre 2017 a marzo de 2019).

- **Construcción de 24 aulas en 3 instituciones educativas – MinEducación**

- ✓ Se adelantó Convenio con FINDETER y se dará inicio a las obras en Mayo de 2018.
Finaliza: Marzo 2019

- **Mejoramiento de 9 sedes educativas– MinEducación**

- ✓ Se adelantó Convenio con FINDETER y se dará inicio a las obras en Junio de 2018
Finaliza: Agosto 2018

COMPROMISOS...

- Estructuración de contrato de obra e interventoría
- **MinEducación:** Entregar información actualizada y detallada.
- Fecha de Finalización: Junio 2019

**Más de 3.000 niños
beneficiados**

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Actividades a realizarse:

- ✓ Cubierta
- ✓ Adecuación de placa deportiva

AVANCE

- ✓ Convenio marco firmado entre UNGRD-Colegio
- ✓ Se suscribió el contrato de obra y acta de inicio.
- ✓ Inicio de Obras desde el 18 de diciembre de 2017.
- ✓ Fundición de Zapatas para estructura de cubierta y zona de tarima.
- ✓ **23%** de avance en la adecuación

COMPROMISO...

- Suscripción contrato de adquisición de material académico

- **Adecuación Colegio Ciudad Mocoa**
\$290 millones
- Donación de Caracol TV (Yo me llamo)
- Adecuación del Laboratorio de Ciencias Naturales y la dotación de la Banda de Paz (Caring for Colombia)



SECTOR
CULTURA

OTRAS OBRAS EDUCATIVAS

• Construcción Biblioteca-MinCultura

\$ 600 millones

AVANCE

- ✓ Ministerio de Cultura realizará la dotación.
- ✓ Embajada de Japón realizará la construcción.
- ✓ En estudios de suelo
- ✓ **100%** Labores de adecuación de terrenos y cerramiento
- ✓ **28%** de avance de obra

Inicio de obras: 5 de Diciembre 2017

Finalización: Marzo 2018



SECTOR
CANCILLERÍA

OTRAS OBRAS EDUCATIVAS

- **Construcción Casa Lúdica- Cancillería
Los Sauces I**

\$ 600 millones

AVANCE

- ✓ Se adelantará la socialización con la comunidad y las autoridades locales el día 28 de noviembre de 2017.
- ✓ **Inicio de Obra:**
Enero de 2017.
- ✓ **Tiempo de construcción:**
4.5 meses

COMPROMISOS...

- En elaboración de diseños para trámite de licencia de construcción

- **Construcción de Espacio Deportivo-Cancillería**

AVANCE

\$ 99 millones

- ✓ Se adelantaron los diseños
- ✓ En trámite Convenio entre la UNGRD, FUPAD y la Cancillería perfeccionado.

Inicio de Obra: Enero 2018

Finalización: Marzo 2018

COMPROMISOS...

- Trámite de licencia de construcción, junto con la Casa Lúdica.
- Perfeccionamiento Convenio

SECTOR

GESTIÓN DEL RIESGO

• Construcción de 4 puentes peatonales

\$ 348 millones

- ✓ **Puente Mulato:** Terminado 100%
- ✓ **Puente Villa Rosa – San Miguel:** Terminado 100%
- ✓ **Puente Dantayaco Vereda San José del Pepino:** Terminado 100%
- ✓ **Puente San Agustín:** Se realizó la visita técnica para la definición del punto.

Fecha de entrega: Febrero 2018 del punto.



Puente Dantayaco



Puente Mulato



Puente Villa Rosa – San Miguel

• Pavimentación de 2.8 Kms de vías

AVANCE

4 tramos terminados
1 tramo en ejecución

10.7 % de avance en obra

283 metros de vía pavimentada de 2.800 mts
proyectados

Vía Victoria Regia-Intervención de 110 ml

- Pavimentación del 100%
- ✓ Vía Pablo VI -intervención de 126 ml
- Pavimentación 100%.
- ✓ Vía La Brigada-intervención de 190 ml
- Obras preliminares 5%.

COMPROMISO...

- La Alcaldía debe suministrar los diseños de las 17 vías faltantes a intervenir.

Tiempo de ejecución:

18 meses
(Octubre 2017 a Marzo 2019)

\$5.000 millones



- **Instalación del SAT**
\$1.223 millones

- ✓ **100%** avance en la implementación del SAT
- ✓ 1 Puesto de monitoreo instalado
- ✓ 12 Sirenas instaladas
- ✓ 11 Sensores de río instalados
- ✓ 4 Estaciones meteorológicas instaladas

- **Estudios y diseños SAT**
\$600 millones

- ✓ **75%** de avance
- ✓ **Finaliza: 30 de enero de 2018.**

- **SAT Comunitario**
\$205 millones

- ✓ **94%** de avance
- ✓ 48 Planes comunitarios formulados
- ✓ 27.800 habitantes beneficiarios

Finaliza: 30 de enero de 2018.



\$360 millones

Actividades a realizarse:

- ✓ Filtros
- ✓ Adecuación y nivelación de terrenos
- ✓ Construcción de parque infantil
- ✓ Rehabilitación del salón social

AVANCE

- ✓ **95%** avance de actividades
- ✓ En proceso compactación de la grama y acabados del salón comunal



COMPROMISO...

- Entrega de la cancha en el mes de Enero de 2018

Tiempo de
ejecución:

3 meses
(Septiembre 2017 a Diciembre 2017)

MEDIOS DE VIDA

Responsable:
UNGRD

INVERSIÓN:
\$ 351 millones

- ✓ **60 medios de vida entregados** para que las familias se reactiven económicamente y activen sus medios de subsistencia.

SUBSIDIOS DE ARRIENDO

Responsable:
UNGRD

INVERSIÓN:
\$ 10.200 millones

7.175 Subsidios otorgados a la fecha
1.485 Primera Prorroga
1.186 Segunda Prorroga

«Los subsidios se cancelan a los beneficiarios hasta la entrega de la solución de vivienda»
Próxima prorrogga en enero de 2018.



ASISTENCIA HUMANITARIA

1.218 Primera Entrega (Octubre)
1.060 Segunda Entrega (Noviembre)
972 Tercera Entrega (Diciembre)
1.045 Cuarta Entrega (enero)

4.295 kits de asistencia humanitaria

entregados a las familias afectadas y registradas en el RUD, que reciben subsidio de arriendo



SECTOR
INFRAESTRUCTURA VÍAL

PUENTES VEHÍCULARES

- **4 puentes vehiculares**
\$9.700 millones

1. Puente sobre la Quebrada San Antonio

- ✓ Contrato en ejecución Concesión Santana-Mocoa- Neiva
- ✓ Fase de Estudios y Diseños completada
- ✓ Proyección de inicio de obras: Febrero 2018
- ✓ **Responsable: ANI**

2. Puente sobre el rio Sangoyaco – Av. Colombia


- ✓ Solicitud de concepto previo al Ministerio de Hacienda de recursos adicionales del INVIAS
- ✓ **Responsable: INVIAS SIN RECURSOS**

3. Puente sobre el rio Sangoyaco - Terminal

- ✓ Solicitud de concepto previo al Ministerio de Hacienda de recursos adicionales del INVIAS
- ✓ **Responsable: INVIAS SIN REVISOR**

4. Puente sobre el rio Mulato - Terminal

- ✓ En etapa de preconstrucción (Estudios y Diseños)
- ✓ **Responsable: INVIAS**

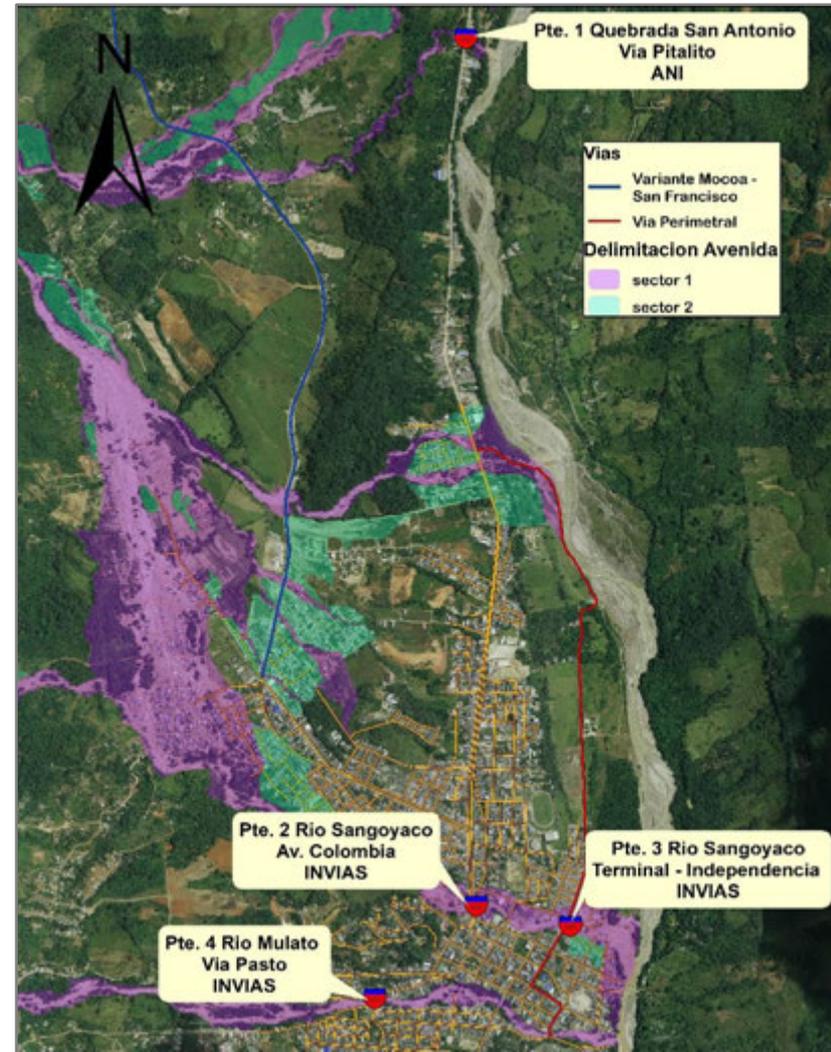

MAQUINARIA Y EQUIPO

AVANCE

- ✓ Priorización de maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía:
 - 1 Bulldozer
 - 2 Carrotanques
 - 1 Retroexcavadora
 - 1 Motoniveladora
 - 1 Vibrocompactador
 - 1 Vactor
- ✓ Proyección adquisición de equipos con recursos de la UNGRD

COMPROMISO...

- Asignación de Recursos al INVIAS por valor de \$4 mil millones (MinHacienda)

- **Combo de Maquinaria Amarilla-INVIAS**

\$ 5.000 millones



SECTOR
ENERGIA

- **Construcción de Subestación eléctrica Definitiva RENACER**

Etapas 1: Funcionamiento de operación móvil, que esta en funcionamiento

Etapas 2: Restablecimiento provisional subestación Junín:

- ✓ **30%** de Avance y se termina en mayo de 2018.

Etapas 3: Construcción nueva subestación Renacer:

- ✓ En Etapa de prediseño
- ✓ En proceso de adquisición predio Vereda Los Guadales

3 años - MINMINAS

COMPROMISO...

- Cronograma de ejecución

\$45.000 millones



- **Subsidios al Consumo de energía eléctrica**

- ✓ Subsidios 100% consumo a estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Mocoa registrados en el R.U.D por **6 meses**.

- ✓ Expedición de la resolución No 41530 del 28 de Diciembre reconociendo este pago para los usuarios registrados de la Empresa de Energía del Putumayo

\$462 millones

CRONOGRAMA FASE II, RESTABLECIMIENTO DE SUBESTACIÓN JUNÍN

Item	Actividad	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
1	Replanteo e Ingeniería de restablecimiento Fase II SE Junín	20-dic-17	30-dic-17
2	Limpieza de: equipos de patio, carcamos, banco de ductos y sala de control	20-dic-17	13/01/2018
4	Instalacion de tableros de control y protecciones	11-dic-17	3-feb-18
3	Tendido y conexonado de cableado de control a equipos de potencia y tableros de protecciones	25-dic-17	3-mar-18
5	Instalación de Equipo Electrógeno y tablero de Servicios Auxiliares	22-ene-18	31-mar-18
6	Prueba y amarillado de planos	26-feb-18	21-abr-18
7	Puesta en servicio	26-feb-18	19-may-18

TIEMPO TOTAL ESTIMADO 6 MESES

CRONOGRAMA FASE III, CONSTRUCCIÓN NUEVA SUBESTACIÓN 230/115/34,4 KV EEP

ÍTEM	HITO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
1	Gestión ambiental	Elaboración de estudios ambientales previos	dic-17	ene-18
2	Gestión ambiental	Estudio de Impacto Ambiental - EIA	feb-18	jul-18
3	Gestión ambiental	Evaluación EIA y licenciamiento	ago-18	nov-18
4	Gestión ambiental	Ejecución del Plan de Manejo Ambiental	dic-18	ene-19
5	Gestión Social	Compra del predio	dic-17	may-18
6	Gestión Subestación	Estudios civiles previos	ago-18	sep-18
7	Gestión Subestación	Diseños de ingeniería conceptual, básica y de detalle y AUI	abr-18	sep-18
8	Gestión Subestación	Compra de equipos	ago-18	feb-19
9	Gestión Subestación	Obras Civiles	oct-18	mar-19
10	Gestión Subestación	Obras Eléctricas	abr-19	abr-20

TIEMPO TOTAL ESTIMADO 2 AÑOS Y 4 MESES

CROMGRAMA FASE III, CONSTRUCCIÓN NUEVA SUBESTACIÓN RENACER 230KV EEB

ÍTEM	HITO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
1	Líneas de transmisión	RESTABLECIMIENTO LÍNEA JAMONDINO	Aug-17	Oct-18
2	Líneas de transmisión	CONTRATOS DE CONEXIÓN	Dic-17	Ene-18
3	Gestión ambiental	GESTIÓN AMBIENTAL	Aug-17	Mar-20
4	Gestión ambiental	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	dic-18	ene-19
5	Gestión Servidumbres	GESTIÓN DE TIERRAS	Feb-18	Ene-20
6	Líneas de transmisión	LINEAS DE TRANSMISIÓN	May-18	Sep-19
7	Gestión Subestación	SUBESTACION	Sep-17	May-20
9	Gestión Adquisiciones	GESTIOND E COMPRAS	Jul-18	Dic-19
10	Gestión Proyecto	PUESTA EN OPERACIÓN	Mar-20	Mar-20

SECTOR
TELECOMUNICACIONES

AVANCE

- 3 Licencias de Emisoras Comunitarias
- 318 MiPymes conformadas en TIC
- 226 Becas en TI – competencias técnico laborales
- Se realizó la instalación de antena en diciembre 2017

EN PROCESO

- **Despliegue de Televisión Digital Terrestre**
- ✓ Se entregarán en febrero 2.500 decodificadores de TDT.

Tiempo de ejecución: **Febrero 2018**

- **Instalación de Punto Vive Digital**
- ✓ Instalación del Punto Vive Digital en el Instituto Tecnológico del Putumayo - ITP

Tiempo de ejecución: **Junio 2018**

\$ 7.100 millones

- Se instalaron **6 zonas WIFI** y se entregaron **4.500 computadores para educar**
 - 11.591 estudiantes beneficiados de 37 sedes educativas



SECTOR
SALUD

• Construcción y dotación Hospital José María Hernández

\$ 33.826 millones

✓ Se adelanta la construcción del Hospital con un avance físico del **33.76%**

Tiempo de ejecución:

Marzo 2020



COMPROMISO...

- Proyectos biomédicos
- Definir fecha de inicio de la construcción.
- Definir la designación de los recursos por parte del Ministerio de Salud.

SECTOR
AMBIENTE

- ✓ Mesa técnica ambiental funcionando
- ✓ IGAC adelantó fotocontrol para elaborar y suministrar ortofoto necesaria para la modelación por SGC.
- ✓ Agencia de Cooperación Internacional del Japón – JICA y Ministerio de Ambiente realizaron modelación.
- ✓ Mediante Resolución No. 1336 de octubre 9 de 2017, Corpoamazonia estableció los determinantes ambientales para la formulación, revisión o modificación del PBOT de Mocoa.
- ✓ Corpoamazonia presentó, dentro del marco de la mesa técnica ambiental, la propuesta para financiación de la etapa de estudios y diseños evaluada en \$ 3.000 millones.
- ✓ Se presentó al DNP el proyecto de obras de mitigación y reducción del riesgo, avaluado en \$130 mil millones para revisión.
- ✓ El MADS realizará visitas a las zonas afectadas en Mocoa, y se llevarán a cabo reuniones con las comunidades indígenas para evaluar y verificar necesidades.



Servicio Geológico Colombiano



- ✓ Se entregaron los estudios de amenaza por movimientos en masa y flujo a escala 1:25000, en las cuencas de las quebradas Taruca, San Antonio y el Carmen, y los ríos Sangoyaco y Mulato.
- ✓ Se entregaron los estudios de amenaza por movimientos en masa y flujo a escala 1:5000 para áreas urbanas y suburbanas.
- ✓ Avances en un 70% microzonificación sísmica, exposición y riesgo sísmico para el área urbana y suburbana.

COMPROMISOS...

- Fotografías para enero 2018.

SECTOR
PLANEACIÓN

• Revisión y ajuste del PBOT + estudios de riesgos

PROGRAMA
POT MODERNOS

Valor:

\$ 4.886* millones

* Incluye estudios de riesgos

Tiempo de ejecución:

9 meses

Actividades adicionales del DNP

- ✓ **Elaboración del documento CONPES 3904:**

PLAN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE **MOCOCA**
2017 - 2022

Valor estimado: \$1.2 billones

122 acciones (infraestructura, desarrollo social, económico e institucional, conectividad e integración regional, ordenamiento territorial)

- ✓ **Apoyo permanente a la Gerencia**
- ✓ **Apoyo para la actualización del Plan de Desarrollo Municipal**

- ✓ **11 de diciembre de 2017:** Presentación del Enlace Territorial ante el Concejo Municipal y el gabinete de la Alcaldía (Consejo de Gobierno de Mocoa)
- ✓ **19 de diciembre de 2017:** visita a centros nucleados con INYPSA
- ✓ **5 de enero a la fecha:** equipo de riesgos en campo recolectando información y visitando las principales fuentes hídricas
- ✓ **11 de enero de 2018:** socialización de la estrategia de participación con la Alcaldía, ASOJUNTAS e INYPSA



- ✓ **Otras actividades en curso:**
 - Identificación, recolección y clasificación de la información disponible
 - Análisis de información básica de riesgos
 - Consecución y adecuación de la sede en Mocoa
 - Reuniones semanales con la Alcaldía y Corpoamazonia

SECTOR
COMERCIO

Recuperación del comercio y la actividad productiva

Reactivación de 170 Negocios formales:

Valor:

\$ 4.250 millones

Primera Fase: 6 a 8 meses
 (Julio 2017 a febrero de 2018)

Segunda Fase: 6 a 8 meses
 (Noviembre 2017 a junio de 2018)

Tiempo de ejecución:

Avance:

- ✓ \$3.000 Millones en ejecución para 120 Negocios iniciales.. A la fecha solo faltan 20 negocios por terminar entrega de apoyos en equipos, maquinarias e inventario.
- ✓ Está en proceso de contratación un cuarto proyecto para reactivación de 50 negocios adicionales.

Cofinanciación: Bancoldex - FNG

- ✓ **Línea de Crédito Bancoldex: Desembolsos por 16.317 Millones** a intermediarios financieros, representados en 326 operaciones y **más de 2.842 beneficiarios.**
- ✓ Garantías – FNG: \$11.003 millones en 581 créditos garantizados.



Comunidades indígenas:

- ✓ En ejecución: Fortalecimiento productivo y comercial de **5 cabildos. Inversión \$250 Millones.**
- ✓ Encuentro regional de Economías Propias MOCOA – Feria de Negocios del 09 al 11 de Nov/17.
 Comunidad Simuyaco - \$ 20 millones
- ✓ Turismo: Ingresos confirmados por valor de \$60 millones, beneficiando a 150 personas.
