



# AVANCE OPERACIÓN MOCOA

EVENTO: AVENIDA TORRENCIAL  
Marzo 31 de 2017 /11:24p.m.  
MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO



GOBIERNO DE COLOMBIA

---

# 1. Balance de Afectación

## EVENTO QUE SE PRESENTÓ

Avenida Torrencial ocasionada por el aumento de los niveles de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato, en el municipio de Mocoa.

## MARCO LEGAL

- Decreto de Desastre para el Municipio de Mocoa No. 599, expedido por el señor Presidente.
- Decreto de Estado Emergencia Económica, Social y Ecológica No. 601, expedido por el señor Presidente.
- Decreto de Calamidad Pública Departamental No. 068 expedido por la Gobernadora
- Decreto de Calamidad Pública Municipal No. 056, expedido por el Alcalde



Puesto de Mando Unificado

## PERSONAS

Heridos	398
Fallecidos*	333
Cuerpos Entregados a las Familias	300
Desaparecidos	76
Familias Registradas en el RUD	7.794
Personas Registradas en el RUD	22.310

## INFRAESTRUCTURA

Barrios Afectados	48
Subestación Eléctrica	1
Acueductos	2
Red de Gas	1
Kilómetros de Vías	11.58
Puentes Destruídos	2
Puentes Averidos	3
Viviendas Afectadas	1.461
Hectáreas Rurales	486,3

\* Fuente: Medicina Legal

## 2. Fases del Proceso



**2.1 RESPUESTA**  
(18 Días)

**2.2 ESTABILIZACIÓN**  
(90 Días)

**2.3 RECUPERACIÓN -  
RECONSTRUCCIÓN**  
(3 AÑOS)



100%  
ABRIL 2017



100%  
JULIO 2017

2017 –2020

**Todo el proceso se adelanta con el acompañamiento de Procuraduría,  
Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y Contraloría**

# 2.1 Fase de Respuesta

## ACTIVACIÓN INMEDIATA

Activación del Protocolo de Respuesta del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en cabeza del señor Presidente de la República.

## PUESTO DE MANDO UNIFICADO

Activación del Puesto de Mando Unificado en menos de 8 horas	<b>120 Reuniones Realizadas</b>
Miembros del SNGRD que operaron	<b>Más de 2.300</b>
Personas Atendidas en los Puestos de Información	<b>Más de 10.000</b>

## ASISTENCIA HUMANITARIA

AHE Alimentaria y No Alimentaria (Mercados, Kits de Aseo, Frazadas, Colchonetas, Kits de Cocina)	<b>2.540 Toneladas Entregadas al 100%</b>
--	---

## APOYO EXEQUIAL

Apoyos Exequiales entregados	<b>297 allecidos</b>
------------------------------	----------------------

**FASE DE RESPUESTA**  
**100%**  
**EN 18 DÍAS DE OPERACIÓN**



## SALUD

Dosis de Vacunas Aplicadas (Tétano, Hepatitis A y Varicela)	<b>57.945</b>
Vacunas Aplicadas Animales	<b>1.639</b>

## ENERGÍA

Energía habilitada el día 11 con una subestación provisional	<b>100%</b>
--	-------------

## TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Restablecimiento de Telefonía y datos	<b>100%</b>
---------------------------------------	-------------



Asistencia Humanitaria de Emergencia

# 2.2 Fase de Estabilización

## AGUA Y SANEAMIENTO

Litros de Agua Entregados

**Más de 88 millones**

Litros de Agua Entregados por Día

**1 millón**

Se utilizaron más de **40 Carrotanques** en la operación, Plantas Potabilizadoras, Motobombas y Tanques de Almacenamiento.

Hoy **3 Carrotanques** se encuentran disponibles

## ALBERGUES TEMPORALES

Personas que estuvieron en los Albergues

**4.561**

Albergues que fueron Habilitados y Administrados

**9**

## SUBSIDIOS DE ARRIENDO

Subsidios de Arriendo Entregados

**4.448**

## FASE DE ESTABILIZACIÓN

**100%**

**90 días**



## TRANSPORTE Y TRASLADOS

Personas que fueron trasladadas a otras ciudades con el apoyo de Cancillería y OIM

**765**



## MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPO

Equipos de Maquinaria Amarilla que fueron utilizados en la operación **208**

**Se utilizaron 51.642 Horas Máquina** para la rehabilitación de vías, remoción de escombros, limpieza de calles y colegios, dragados y reconfiguración de cauce de los ríos y quebradas.

## INFRAESTRUCTURA

Puentes Vehiculares habilitados (1 Puente Militar) **4**

Vías Nacionales Habilitadas **3**

## AGUA

Bocatomas Rehabilitadas **4**

Zona con Disponibilidad de Agua Potable terminada (Suroccidente) **1**

Zonas con Disponibilidad de Agua Cruda (Centro, Barrios Unidos y Norte) **3**

Suministro de materiales-UNGRD, Soporte Técnico-MinVivienda, Logística- Ejército Nacional

## EDUCACIÓN

Sedes Educativas Habilitadas **57**

Aulas Móviles Instaladas **8**

Kits Escolares Entregados **14 mil**

## COMERCIO

Comerciantes Caracterizados **354**

Exención del IVA



## CULTURA

Libros y lámparas entregadas a niños	<b>2.056</b>
Jornadas Socioculturales	<b>61</b>

## AMBIENTE

Elaboración del Mapa de Zonificación de Riesgo (Mesa Técnica de Ambiente)	<b>1</b>
---	----------

## EMPLEO Y CAPACITACIÓN

Empleos Generados: (Remoción de Escombros, Manejo de Maquinaria)	<b>270</b>
--	------------

## NIÑEZ

Suplemento Alimenticio para Niños y Madres Gestantes	<b>47 Toneladas entregadas</b>
--	--------------------------------

## CONTINUAMOS EN ...

- Pago de subsidios de arriendos semestre anticipado y paquete alimentario cada mes.

## OPERACIÓN DE LA OFICINA DEL GOBIERNO NACIONAL PERMANENTE EN MOCOA - OGN



## 2.3 Fase de Reconstrucción

---



# \$ 1,2 billones

Periodo: 2017-2022

Departamento Nacional de Planeación

✓ Comprende **122 acciones** en 6 líneas de acción estratégicas:

- Ordenamiento Territorial, Ambiente y Gestión del Riesgo.
- Infraestructura Social.
- Conectividad e Integración Regional.
- Desarrollo Económico.
- Desarrollo Social.
- Desarrollo Institucional.

PLAN PARA LA  
RECONSTRUCCIÓN  
DE  
**MOCOA**  
2017 - 2022

Documento  
**CONPES**

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL  
REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

3904

# MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

---



## 1.209 Viviendas Urbanas

### Fase 1: 300 Viviendas, Sauces I.

\$ 22.260 millones

Tiempo de ejecución:

1 año  
(Mayo 2017- Mayo 2018)

#### Avance:

- ✓ Cronograma de terminación de viviendas:

Mes-2018	Nº Viviendas
Marzo	100
Mayo	200
<b>Total</b>	<b>300</b>

- ✓ Se dio inicio a la convocatoria para la postulación de familias al subsidio de vivienda, por MinVivienda.

#### Compromisos:

- Entrega de las primeras **100 viviendas** el 1 de abril de 2018-MinVivienda



Avance Construcción Fase I Vivienda Urbana – Los Sauces I



Avance Construcción Fase I Vivienda Urbana – Los Sauces I

## Fase 2: 909 viviendas, Sauces II.

\$60.448 millones

Tiempo de ejecución:

18 meses  
(Marzo 2018-  
Septiembre 2019)

### Avance:

- ✓ Adquisición del predio Sauces II de 16.93 Hectáreas, por expropiación.
- ✓ La construcción se adelantará en dos frentes de trabajo:

1. Construcción de 528 viviendas
2. Construcción de 381 viviendas

### Compromisos:

- En una semana contratar la obra e interventoría, por MinVivienda y la UNGRD



Predio - Sauces II



## ■ Construcción del Sistema de Acueducto

**\$28.074 millones**

**Tiempo de ejecución:** 12 meses

### Avance:

- ✓ 100% la bocatoma alterna.
- ✓ Apoyo logístico del ejercito para cumplir con la bocatoma alterna
- ✓ 60,5% de avance físico en la instalación de redes.
- ✓ Se avanza en la construcción de las líneas de conducción de agua tratada sectores Norte y Suroccidente.
- ✓ 8,489 metros lineales instalados de redes de acueducto.

### Compromisos:

- Iniciar con las obras de rehabilitación de la estructura de captación existente.

## • Plan Maestro de Alcantarillado

**\$91.200 millones**

### Avance:

- ✓ En febrero de 2018 se firmó minuta para suscribir el contrato de préstamo con el BID.



*Bocatoma Alterna Terminada*



*Transporte Materiales para Bocatoma Alterna*



\$ 4.473 millones

**Fecha de Finalización** Julio de 2018

## Avance:

- ✓ 2% de avance físico de la obra.

## Compromisos:

- Se adelanta el proceso de adquisición de la dotación del CDI – UNGRD, con los recursos donados por “Give To Colombia”.



# MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

---

**252 viviendas.**

**\$13.467 millones**

**Plazo de Ejecución**

**18 meses**

## Avance:

- ✓ Se identificó predio de 25 hectáreas, ubicado en la vereda Los Recuerdos.
- ✓ Se solicitó el avalúo del predio por al IGAC, el día 5 de febrero de 2018.

## Compromisos:

- Entrega del avalúo por parte del IGAC.
- Una vez se tenga el avalúo la UNGRD adelantará la adquisición del Predio.

## NOTA

- De acuerdo con la solicitud del Alcalde, se destinarán 6 hectáreas para la construcción de soluciones de vivienda por parte de la Corporación Antioquia Presente en alianza con El Minuto de Dios.



*Predio – Los Recuerdos*

\$ 1.020 millones

**Tiempo de ejecución** 6 meses  
(Febrero-Agosto 2018)

## Avance:

- ✓ 180 familias a ser beneficiadas.
- ✓ Se suscribió convenio entre el FNGRD, MinAgricultura y la Alcaldía.
- ✓ El MinAgricultura realizó el desembolso el 29 de enero de 2018.
- ✓ Componentes del proyectos:
  - Avicultura.
  - Cítricos.
  - Plátano.
  - Aguacate.
  - Asistencia Técnica.
  - Suministro de Herramientas y Equipos.
- ✓ Fue adjudicado el proyecto a la fundación SERVIAGRO. El contrato se encuentra en fase de perfeccionamiento.

**350 viviendas**

**\$6.220 millones**

## Avance:

- ✓ La Alcaldía remitió listado con potenciales familias a ser beneficiadas.

## Compromisos:

- El Ministerio de Agricultura realizará la presentación del proyecto en la Comisión de Vivienda, para definir la disponibilidad de recursos para la vigencia 2018 de acuerdo a los “Programas Estratégicos Bolsa Nacional – Agencia Nacional de Desarrollo Rural” - MinAgricultura



# PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

---

\$ 2.500 millones

**Tiempo de ejecución:** 1 año

## Avance:

- ✓ Findeter Ejecutor de la Obra.
- ✓ Construcción del CDI en zona de sesión del predio de vivienda rural «El Recuerdo»

## Compromisos:

Entrega de la zona de sesión a la Consejería Presidencial para la Primera Infancia

# PROSPERIDAD SOCIAL

---

\$8.100 millones

29 meses  
(Diciembre 2017 a  
Marzo de 2020)

## Avance:

- ✓ Se adquirió el predio Santa Mónica de 2 hectáreas, por proceso de expropiación.
- ✓ Se suscribió convenio entre Prosperidad Social y la UNGRD para la construcción.
- ✓ la UNGRD adelanta el proceso contractual de obra e interventoría.
- ✓ Se realizó el cerramiento del predio.

## Compromisos:

- Aprobación del Plan Operativo de Ejecución del convenio por parte del DPS, para iniciar las obras.



Predio Santa Mónica

**300 viviendas**

**\$4.972 millones**

**Plazo de Ejecución**

**6 meses**

## Avance:

- ✓ Convenio con el operador UNOPS, para la ejecución del proyecto en tres etapas:
  - **1era Etapa:** 120 viviendas.  
Duración: 3,5 meses (Marzo - Junio 2018)  
Inicio de obras: 05 de marzo
  - **2da Etapa:** 100 viviendas.  
Duración: 3 meses (Marzo - Mayo 2018)
  - **3ra Etapa:** 80 viviendas.  
Duración: 2,5 meses (Mayo - Julio 2018).

## Compromisos:

- Expedición de certificaciones de condiciones de habitabilidad de 37 viviendas – Alcaldía.
- **2da Etapa:** Aprobación por parte del comité de estructuración - 27 de marzo.
- **3ra Etapa:** Aprobación por parte del comité de estructuración - 10 de abril.





## ■ Más Familias en Acción y Jóvenes en Acción

\$3.500 millones

### Avance:

- ✓ El Banco Agrario apoyó la expedición de tarjetas débito.
- ✓ 1.124 jóvenes favorecidos con apoyo económico para acceso a educación superior.

## ■ Mi Negocio

\$31.972 millones

### Avance:

- ✓ 500 cupos para la creación de nuevos negocios.
- ✓ Otorgamiento de capital hasta por \$4 millones por negocio.
- ✓ Se avanza en la entrega de maquinaria e insumos a más de 430 emprendedores.

## ■ Red Unidos y Donaciones

\$1.050 millones

### Avance:

- ✓ Se realizó una feria de servicios y el acompañamiento a 1.979 hogares.
- ✓ Entrega de ropa, calzado y elementos de cocina

# MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

---

- **Construcción del Mega Colegio ubicado en el predio Sauces II.**

**\$ 8.500 millones**

**Tiempo de ejecución:** 14 meses  
(Marzo-Mayo 2019)

**Avance:**

- ✓ Se suscribió convenio entre UNGRD y MinEducación.
- ✓ Se adelantan los estudios previos y anexos técnicos.

**Compromisos:**

- A la espera de estudio de niveles del predio sauces II, para iniciar la contratación de la obra.



Área de Cesión Mega Colegio - Predio Sauces II

- **Construcción de 24 Aulas en 3 Instituciones Educativas**

**\$ 8.500 millones**

**Tiempo de ejecución:** 1 año  
(Marzo-Marzo 2019)

**Avance:**

- ✓ Se suscribió convenio con Findeter.
- ✓ En proceso etapa de estudios y diseños.
- ✓ Las aulas son las siguientes:
  - 6 aulas en la institución educativa Pio XII
  - 10 aulas en la institución educativa Simón Bolívar
  - 8 aulas en la institución educativa rural Alto Afán

- **Mejoramiento de 9 Sedes Educativas**

\$ 2.897 millones

**Tiempo de ejecución:** 3 meses  
(Mayo-Julio 2018)

**Avance:**

- ✓ Se suscribió convenio con Findeter .
- ✓ En proceso contratación de estudios y diseños.

- **Construcción del Centro Educativo Fray Placido por la Gobernación del Putumayo.**

\$ 7.500 millones

**Tiempo de ejecución:** 10 meses

**Avance:**

- ✓ En proceso contratación de estudios y diseños.

- **Intervención de 6 aulas del Centro Educativo Kamentsa por la Gobernación del Putumayo.**

\$ 1.180 millones

**Fecha de finalización:** Abril 2018

#### Avance:

- ✓ **59%** avance físico de la obra.

#### Compromisos:

Realizar visita técnica por parte del Ministerio a la institución educativa del resguardo indígena Inga sede Belén del Palmar en la vereda el Líbano, para la intervención de 5 aulas por valor de \$900 millones, de los cuales el MinEducación aportaría \$500 millones y la Gobernación \$400 millones.

- **Pilos Por Mocoa**

\$ 1.805 millones

**Avance:**

- ✓ En la cuarta convocatoria ingresaron 89 beneficiarios; 39 por puntaje nacional (igual o mayor a 348) y 51 por capítulo especial Mocoa (igual o mayor a 313).
- ✓ Los 51 cupos adicionales del capítulo especial “Pilos por Mocoa” se adjudicaron a jóvenes residentes de este municipio que cuentan con el puntaje SISBEN establecido en la convocatoria nacional y que cumplen con el puntaje mínimo establecido.

- **Congelación deudas Icetex**

\$ 26.800 millones

**Avance:**

- ✓ Congelamiento de intereses corrientes
- ✓ Los créditos otorgados para Mocoa que están congelados (suspendidos) benefician 2.294 estudiantes,

- **Atención Psicosocial**

**Avance:**

- ✓ Más de 500 profesores y 1.000 estudiantes atendidos con apoyo de aliados.
- ✓ Formación a más de 50 formadores y tutores.

\$727 millones

## Avance:

- ✓ Se realizó la entrega de la totalidad de los uniformes para 2.518 estudiantes.
- ✓ Cumplido 100%.



Entrega de Uniformes Escolares



# MINISTERIO DE CULTURA

---

\$372 millones

**Fecha de Finalización:** Marzo de 2018

## Avance:

- ✓ **100% avance de obra.**
- ✓ 100% Dotación de mobiliario.
- ✓ 100% dotación Bibliográfica (una vez se garantice la prestación del servicio eléctrico y de agua).

## Compromisos:

- Instalación de servicios públicos por parte de la Alcaldía.



# MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

---

# Construcción y Dotación Hospital José María Hernández

**\$33.826 millones**

**Fecha de Finalización:** Marzo de 2020

## Avance:

✓ **42%** de avance físico en la obra.

## Compromisos:

- Definir los proyectos biomédicos a desarrollarse por el Ministerio de Salud.



# CANCILLERÍA

---

## • Construcción Casa Lúdica Los Sauces I

\$ 800 millones

**Tiempo de ejecución :**

4.5 meses  
(Marzo-Julio 2018)

### Avance:

- ✓ Etapa de estudios y diseños culminada.
- ✓ Se dio inicio a las obras preliminares el día 12 de febrero de 2018 y se realizó el cerramiento del predio.



Avance Obras Preliminares Casa Lúdica

## • Construcción de Cancha Múltiple Deportiva Los Sauces I

\$ 99 millones

**Tiempo de ejecución :**

4.5 meses  
(Marzo-Julio 2018)

### Avance:

- ✓ Se suscribió convenio suscrito entre la UNGRD, FUPAD y la Cancillería.
- ✓ Se entregó el predio a la cancillería para adelantar la obra.

### Compromisos:

- Cancillería y FUPAD adelantar la contratación de la obra.



# UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

---

- **Instalación del SAT**

\$1.223 millones

**Avance:**

- ✓ **100%** de avance en la implementación del SAT.
- ✓ 1 puesto de monitoreo instalado
- ✓ 11 sensores de río colocados
- ✓ 4 estaciones meteorológicas instaladas
- ✓ 12 sirenas instaladas

- **Estudios y diseños SAT**

\$600 millones

**Avance:**

- ✓ **100%** terminado y entregado a la Alcaldía y al Coordinador del SAT financiado por la UNGRD, en convenio con la Universidad Javeriana.

- **SAT Comunitario**

\$205 millones

**Avance:**

- ✓ **100%** en la implementación del SAT comunitario.



*SAT terminado y entregado*

# Rehabilitación Cancha Deportiva El Pepino y Sal3n Comunal

\$360 millones

Tiempo de ejecuci3n:

3 meses  
(Septiembre 2017 a  
Diciembre 2017)

Avance:

✓ 100% terminado y listo para entrega oficial.



\$413 millones

**Tiempo de ejecución:** 3 meses  
(Enero-Marzo 2018)

## Avance:

- ✓ 70% de avance físico en la adecuación de la cubierta y acceso peatonal al colegio, con los recursos donados por *Caracol TV (Yo me llamo)*.
- ✓ Se adelanta proceso de contratación de la dotación con recursos de *Caring For Colombia*.



Avance adecuación del Colegio Ciudad Mocoa



\$351 millones

**Avance:**

- ✓ 60 medios de vida entregados al 100%, para que las familias se reactiven económicamente y activen sus medios de subsistencia.



*Medios de Vida*



*Medios de Vida*

\$ 348 millones

## Avance:

- ✓ **Puente Mulato:** 100% terminado.
- ✓ **Puente Villa Rosa – San Miguel:** 100% terminado.
- ✓ **Puente Dantayaco:** 100% terminado.
- ✓ **Puente San Agustín:** Para inicio de obra





\$5.000 millones

Tiempo de ejecución:

18 meses  
(Octubre 2017 - Marzo 2019)

## Avance:

- ✓ 3 vías terminadas
- ✓ 3 vías en ejecución

## Estado de la Pavimentación de Vías:

- ✓ **Victoria Regia** : 100%
- ✓ **Pablo VI** : 100%
- ✓ **La Brigada**: 80% (Marzo 2018)
- ✓ **Barrio Obrero Etapa 2**: 40% (Marzo 2018)
- ✓ **José Homero**: 5% (Marzo 2018)

## Compromisos:

- Remisión por parte de la Alcaldía de la información referente a las vías a pavimentar (Tramos, certificados de redes de servicios públicos, diseños).



Vía Victoria Regia



Avance intervención Vía La Brigada



Avance intervención Vía Barrio Obrero

- **Subsidios de Arriendo**  
\$10.200 millones


**Avance:**

- ✓ 1.220 familias beneficiadas con subsidio pago semestre anticipado

- **Kits de Asistencia Alimentaria**  
\$503 millones

**Avance:**

- ✓ Se entrega 1.220 kits de asistencia alimentaria cada mes

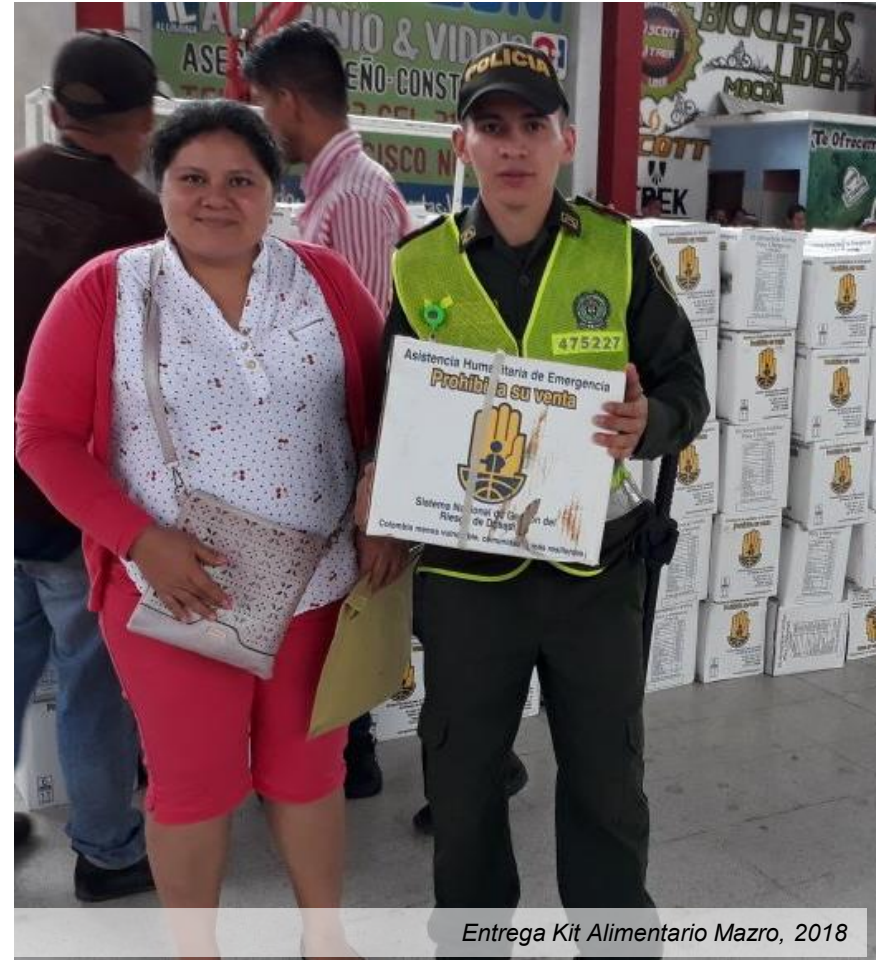

Entrega Kit Alimentario Mazro, 2018

# MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

---

- **Restablecimiento provisional estación Junín**

**Fecha terminación**

Marzo 2018.

**Avance:**

- ✓ 40% de avance físico,
- ✓ Reconstrucción de la sala de control y remplazo e instalación de tableros.

- **Construcción de la nueva subestación “RENACER” (230 kv):**

**\$ 45.000 millones**

**Fecha terminación**

Marzo 2020.

**Avance:**

- ✓ 7% de avance físico
- ✓ Fue definido el lote para la ubicación de la subestación en la Vereda Los Guadales.

- **Subsidios de Energía y Gas Natural**

**\$554 millones**

**Avance:**

- ✓ Por un periodo de 6 meses se otorgaron subsidios de energía a los damnificados de estratos 1, 2 y 3 y subsidios de gas natural a los damnificados de estratos 1 y 2, registrados en el RUD.



# MINISTERIO DE TRANSPORTE

---

\$16.100 millones

## 1. Puente sobre la Quebrada San Antonio

- ✓ Fase de estudios y diseños finalizada.
- ✓ **Fecha de inicio de obras:** Febrero 2018
- ✓ **Responsable:** ANI

## 2. Puente sobre el río Sangoyaco – Av. Colombia

- ✓ Fase de estudios y diseños finalizada.
- ✓ Invias cuenta con \$ 3.000 millones para dar inicio a la obras.
- ✓ Se realizó solicitud de concepto previo al Ministerio de Hacienda para asignación de recursos por \$7.000 millones.
- ✓ **Responsable:** INVIAS

## 3. Puente sobre el río Sangoyaco – Terminal

- ✓ Se realizó solicitud de concepto previo al Ministerio de Hacienda para asignación de recursos.
- ✓ **Responsable:** INVIAS
- ✓ **Estado:** En trámite

## 4. Puente sobre el río Mulato

- ✓ Fase de estudios y diseños finalizada.
- ✓ **14%** de avance físico de la obra
- ✓ Responsable: INVIAS
- ✓ Fecha finalización: 15 de abril de 2018.



*Avance Construcción Puente Vehicular Mulato*



\$5.000 millones

## Avance:

- ✓ La Alcaldía realizó priorización de maquinaria amarilla a adquirir, de la siguiente manera:
  - 1 Bulldozer
  - 2 Carrotanques
  - 1 Retroexcavadora
  - 1 Motoniveladora
  - 1 Vibrocompactador
  - 1 Vactor
- ✓ **Estado:** En trámite

## Compromisos:

- Asignación de recursos al INVIAS por valor de \$5.000 millones - MinHacienda.



# MINISTERIO DE AMBIENTE

---

- **Estudios y Diseños de Obras de Mitigación**  
\$3.000 millones

**Fecha de finalización:** Mayo 2018

## Avance:

- ✓ Se firmó convenio entre MinAmbiente y la UNGRD, para el acompañamiento técnico en el desarrollo de los Estudios y Diseños para las Obras de Mitigación.
- ✓ El día 27 de febrero se dio inicio a la ejecución del convenio.
- ✓ El Ministerio de Ambiente sirvió como facilitador ante Corpoamazonia para la expedición de licencias ambientales de los proyectos de construcción del Sistema de Acueducto y del Centro de Desarrollo Infantil - MinVivienda

## Compromisos:

- Adelantar el proceso de contratación para la elaboración de los Estudios y Diseños (3 de Marzo de 2018)-UNGRD.

- **Construcción de Obras de Mitigación**  
\$ 130.000 millones

## Avance:

- ✓ Se presentó proyecto al DNP para la definición de la financiación del proyecto.
- ✓ El martes 13 de febrero, se llevó a cabo la Mesa Técnica Ambiental para la revisión de las obras de reducción y mitigación del riesgo:
  1. El encausamiento de las quebradas Taruca y Taruquita.
  2. Recuperación de la ronda hídrica del río Mulato y del río Sangoyaco.
- ✓ Corpoamazonía contrato el estudio del eje ambiental de la Quebrada Taruca – Río Sangoyaco.



Mesa Técnica Ambiental – 13/02/2018

- **Estudios de Movimiento en Masa y Flujo**

\$1.100 millones

**Avance:**

- ✓ Con el apoyo del Servicio Geológico Colombiano se entregaron los estudios de amenaza por movimientos en masa y flujo a escala 1:25000, en las cuencas de las quebradas Taruca, San Antonio y el Carmen, y los ríos Sangoyaco y Mulato.
- ✓ Se entregaron los estudios de amenaza por movimientos en masa y flujo a escala 1:5000 para áreas urbanas y suburbanas.

- **Estudios de Microzonificación Sísmica:**

**Fecha de finalización:** Marzo 2018

**Avance:**

- ✓ 90% de avance en microzonificación sísmica, exposición y riesgo sísmico para el área urbana y suburbana.



# MINISTERIO TIC

---

\$ 7.100 millones

## Avance:

- ✓ Se realizó la entrega de:
  - 3 licencias de emisoras comunitarias.
  - 226 becas en TI- competencias técnico laborales
  - 4.500 equipos de computo
  - 3.970 computadores para educar a 33 sedes educativas pertenecientes a etnias indígenas.
- ✓ Se apoyo en la creación de 318 MiPymes conformadas en TIC.
- ✓ Se instalaron 4 zonas WiFi.
- ✓ Se impartieron capacitaciones a la totalidad de docentes en el municipio y se hizo entrega de equipos para el desarrollo de sus labores.
- ✓ Se elaboró convocatoria de Mintic e Innpulsa por \$250 millones para acompañar la transformación digital de 200 MiPymes del municipio.



Entrega de Computadores para Educar

## Compromisos:

- Instalación de 2 zonas WiFi: Se realizará la entrega en el mes de marzo de 2018.
- Despliegue de televisión digital terrestre: Realizar la entrega de 2.500 decodificadores de TDT en el mes de Marzo de 2018.
- Instalación de punto Vive Digital: Realizar la instalación de un punto en el Instituto Tecnológico del Putumayo en el mes de Junio de 2018.



# MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

---

\$ 21.138 millones

- **Reactivación de 170 Negocios Formales:**

**Avance:**

- ✓ \$4.250 millones en inversión para la recuperación de 170 negocios formales.
- ✓ A la fecha 123 negocios se encuentran funcionando con equipos, maquinaria, inventario y acompañamiento.
- ✓ Se encuentra en ejecución la recuperación de 47 negocios.

- **Cofinanciación: Bancoldex - FNG**

**Avance:**

- ✓ Línea de Crédito Bancoldex: Desembolsos por \$ 18.701 millones desembolsados para beneficiar a 2.801 empresarios a través de 3.189 operaciones.
- ✓ Garantías – FNG: \$12.334 millones en 742 créditos garantizados.



- **Comunidades indígenas:**

**Avance:**

- ✓ En 2017 se realizó inversión de \$250 Millones para el fortalecimiento productivo y comercial de 5 cabildos.
- ✓ Durante el año 2018 serán invertidos \$200 millones en acompañamiento técnico a las comunidades.

**\$ 252 millones**

- **Acciones ejecutadas para la promoción del turismo en el Municipio de Mocoa:**

- ✓ Plan promocional del destino a nivel departamental.

**Valor inversión: \$70 millones**

- ✓ Enlace al proyecto de “Turismo, Paz y Convivencia- Cogestores de Paz”.

**Valor inversión: \$36 millones**

- ✓ Participación departamental en la versión XXXVII de la Vitrina Turística ANATO 2018.

**Valor inversión: \$4 millones**

- ✓ Inclusión del Municipio de Mocoa como atractivo turístico en la estrategia de corredores turísticos.

**Valor inversión: \$12 millones**

- ✓ Programa para la enseñanza del idioma inglés a los prestadores turísticos registrados.

**Valor inversión: \$64 millones**

- ✓ Consultoría para asistencia técnica a instituciones educativas, para que sean parte de la Red Colegios Amigos del Turismo.

**Valor inversión: \$32 millones**

- ✓ Programa de capacitación en servicio al cliente a los prestadores turísticos registrados.

**Valor inversión: 36 millones**

# DEPARTAMENTO NACIONAL PLANEACIÓN

---

\$ 4.886\* millones

\* Incluye estudios de riesgos

**Tiempo de ejecución:** 9 meses

## Avance:

- ✓ **11 de diciembre de 2017:** Presentación del Enlace Territorial ante el Concejo Municipal y el gabinete de la Alcaldía (Consejo de Gobierno de Mocoa).
- ✓ **19 de diciembre de 2017:** visita a centros nucleados con INYPSA.
- ✓ **5 de enero a la fecha:** equipo de riesgos en campo recolectando información y visitando las principales fuentes hídricas.
- ✓ **11 de enero de 2018:** socialización de la estrategia de participación con la Alcaldía, ASOJUNTAS e INYPSA.
- ✓ **Otras actividades en curso:**
  - Identificación, recolección y clasificación de la información disponible.
  - Análisis de información básica de riesgos.
  - Consecución y adecuación de la sede en Mocoa.
  - Reuniones semanales con la Alcaldía y Corpoamazonia.

PROGRAMA  
**POT**  
MODERNOS



# 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

---



## VALOR DONACIONES EN EFECTIVO - UNGRD CUENTA DAVIVIENDA NO. 021666888

Donaciones Nacionales	10.089.155.785
Donaciones Países, Gobiernos y personas en el exterior	27.255.048.913
<b>TOTAL RECAUDADO</b>	<b>\$ 37.344.204.698</b>

## ASIGNACIÓN RECURSOS DONACIONES

300 Viviendas urbanas Sauces I (Adquisición de predio, estudios y diseños)	3,372,489,040
909 Viviendas urbanas Sauces II (Adquisición de predio)	1,185,665,880
252 Viviendas rurales (Adquisición de predio)	1,252,773,000
Plaza de Mercado (Adquisición de predio, adecuaciones y servicios públicos)	2,100,000,000
Pavimentación de vías urbanas	5,000,000,000
Construcción Megacolegio Sauces II	8,500,000,000
Uniformes estudiantes de Mocoa	718,017,000
Mejoramiento y dotación Colegio Ciudad Mocoa (Destinación específica del Donante)	412,793,200
Dotación del Centro de Desarrollo Infantil (Destinación específica del Donante)	173,366,667
Estudios y diseños para las obras de mitigación	3,000,000,000
Asistencia Humanitaria de Emergencia (Destinación específica del BID)	569,200,000
Construcción de vivienda comunidad indígena	880,000,000
<b>TOTAL ASIGNADO</b>	<b>\$ 27,164,304,787</b>

TIPO	ELEMENTOS	DONANTE	ESTADO
<b>ASISTENCIA HUMANITARIA DE EMERGENCIA</b>	2,500 toneladas de Asistencia Humanitaria de Emergencia	<b>COMUNIDAD y SECTOR PRIVADO</b>	Distribuido en un 100% a más de 7.000 familias
<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>	329 Tanques agua 500l; 52 Tanques agua 250l; 25 Tanques agua 1000l; 15 Tanques agua 2000l; 126 Canecas 20l	<b>COLEMPAQUES</b>	En proceso de instalación en proyectos de reconstrucción de Mocoa (Vivienda Urbana y Vías).
	3 kits Tanques de almacenamiento de 6.000L	<b>SKINCO GYPLAC</b>	Instalados y utilizados en Alojamientos Temporales
<b>INSUMOS Y ELEMENTOS PARA INSTITUCIONES MÉDICAS</b>	Medicamentos, 200 kits de aseo básico, 100 lámparas solares	<b>GOBIERNO DE TURQUÍA</b>	Entregados a las entidades locales de salud. Coordinado por el Sistema Nacional del Salud
	Elementos Hospitalarios	<b>GLOBAL LINK/ OPS</b>	
<b>ALOJAMIENTOS TEMPORALES</b>	63 Cajas Shelterbox (carpas familiares)	<b>SHELTERBOX</b>	Entregadas a 63 familias en zona rural de Mocoa
<b>ENERGÍA</b>	30 Generadores eléctricos de 60 Hz	<b>GOBIERNO DE JAPÓN</b>	Desplegados en la zona cuando se requirieron y en pre-posicionamiento en el CNL
	1 planta eléctrica	<b>EDUARDOÑO</b>	
<b>LOGÍSTICA</b>	Contenedor nevera para conservación de cadáveres	<b>AMERISUR</b>	
<b>TELECOMUNICACIONES</b>	10 equipos portátiles de comunicación de dos vías Digital	<b>ASECONES</b>	Asignados y en operación en el Sistema de Alerta Temprana de Mocoa
<b>ELEMENTOS AUDIOVISUALES</b>	Mapas e Imágenes de drones de alta precisión	<b>GLOBAL MEDIC</b>	Entrados al SNGRD para toma de decisiones

# Asignación Recursos PGN -UNGRD

## Fondo Interministerial

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	VALOR \$
<b>I. RESPUESTA</b>	<b>7,346,945,825</b>
1. ASISTENCIA HUMANITARIA DE EMERGENCIA	6,604,445,830
2. APOYO EXEQUIAL	742,499,995
<b>II. ESTABILIZACIÓN</b>	<b>30,579,142,012</b>
3. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	7,544,121,985
4. TRABAJOS DE MITIGACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CAUCES	5,895,026,962
5. SUBSIDIOS DE ARRIENDO	10,200,000,000
6. ALBERGUES TEMPORALES	5,885,510,172
7. MEDIOS DE VIDA	82,400,000
8. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	372,829,504
9. OPERACIÓN Y LOGÍSTICA	474,020,793
10. INFRAESTRUCTURA DE EMERGENCIA	125,232,596
<b>III. RECONSTRUCCIÓN</b>	<b>2,073,912,163</b>
11. SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	2,073,912,163
<b>TOTAL</b>	<b>40,000,000,000</b>
