



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres - Colombia

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD certificado en:



Certificado No. SG 2015001782 (A - B - F - H)

BALANCE OPERACIÓN MOCOA

EVENTO: AVENIDA TORRENCIAL
Marzo 31 de 2017 / 11:24p.m.
MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DE
PUTUMAYO

30 de Enero de 2018

EVENTO QUE SE PRESENTÓ

Avenida Torrencial ocasionada por el aumento de los niveles de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato, en el municipio de Mocoa.

MARCO LEGAL

- Decreto de Desastre para el Municipio de Mocoa No. 599, expedido por el señor Presidente.
- Decreto de Estado Emergencia Económica, Social y Ecológica No. 601, expedido por el señor Presidente.
- Decreto de Calamidad Pública Departamental No. 068 expedido por la Gobernadora
- Decreto de Calamidad Pública Municipal No. 056, expedido por el Alcalde



PERSONAS

Heridos	398
Fallecidos*	333
Cuerpos Entregados a las Familias	300
Desaparecidos	76
Familias Registradas en el RUD	7.794
Personas Registradas en el RUD	22.310

INFRAESTRUCTURA

Barrios Afectados	48
Subestación Eléctrica	1
Acueductos	2
Red de Gas	1
Kilómetros de Vías	11.58
Puentes Destruídos	2
Puentes Averiados	3
Viviendas Afectadas	1.461
Hectáreas Rurales	486,3

ACTIVACIÓN INMEDIATA

Activación del Protocolo de Respuesta del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en cabeza del señor Presidente de la República.

PUESTO DE MANDO UNIFICADO

Activación del Puesto de Mando Unificado en menos de 8 horas **120 Reuniones Realizadas**

Miembros del SNGRD que operaron **Más de 2.300**

Personas Atendidas en los Puesto de Información **Más de 10.000**

ASISTENCIA HUMANITARIA

AHE Alimentaria y No Alimentaria (Mercados, Kits de Aseo, Frazadas, Colchonetas, Kits de Cocina) **2.540 Toneladas Entregadas**

Incluidas las Donaciones de la Primera Dama, Empresas Privadas y Comunidad

APOYO EXEQUIAL

Apoyos Exequiales entregados **297 Fallecidos**

FASE DE RESPUESTA
100%
EN 18 DÍAS DE OPERACIÓN



SALUD

Dosis de Vacunas Aplicadas (Tétano, Hepatitis A y Varicela) **57.945**

Vacunas Aplicadas Animales **1.639**

ENERGÍA

Energía habilitada el día 11 con una subestación provisional **100%**

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Restablecimiento de Telefonía y datos **100%**



AGUA Y SANEAMIENTO

Litros de Agua Entregados	Más de 88 millones
Litros de Agua Entregados por Día	1 millón

Se utilizaron más de **40 Carrotanques** en la operación, Plantas Potabilizadoras, Motobombas y Tanques de Almacenamiento.

Hoy 3 Carrotanques se encuentran disponibles

ALBERGUES TEMPORALES

Personas que estuvieron en los Albergues	4.561
Albergues que fueron Habilitados y Administrados	9

SUBSIDIOS DE ARRIENDO

Subsidios de Arriendo Entregados	4.448
----------------------------------	--------------

Valor Subsidios: \$10.200 millones
Hasta junio de 2018

FASE DE ESTABILIZACIÓN

100%
90 días



Familias Albergue el Pepino

Transporte y traslados

Personas que fueron trasladadas a otras ciudades con el apoyo de Cancillería y OIM	765
--	------------

MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPO

Equipos de Maquinaria Amarilla que fueron utilizados en la operación **208**

Se utilizaron 51.642 Horas Máquina para la rehabilitación de vías, remoción de escombros, limpieza de calles y colegios, dragados y reconfiguración de cauce de los ríos y quebradas.

INFRAESTRUCTURA

Puentes Vehiculares habilitados (1 Puente Militar) **4**

Vías Nacionales Habilitadas **3**

AGUA

Bocatomas en Rehabilitación **4**

Zona con Disponibilidad de Agua Potable terminada (Suroccidente) **1**

Zonas con Disponibilidad de Agua Cruda (Centro, Barrios Unidos y Norte) **3**

Suministro de materiales-UNGRD, Soporte Técnico-
MinVivienda, Logística- Ejército Nacional

COMERCIO

Comerciantes Caracterizados **354**

Exención del IVA

EDUCACIÓN

Sedes Educativas Habilitadas **57**

Aulas Móviles Instaladas **8**

Kits Escolares Entregados **14 mil**



Planta Potabilizadora de Agua

CULTURA

Libros y lámparas entregadas a niños	2.056
Jornadas Socioculturales	61

AMBIENTE

Elaboración del Mapa de Zonificación de Riesgo (Mesa Técnica de Ambiente)	1
---	----------

EMPLEO Y CAPACITACIÓN

Empleos Generados: (Remoción de Escombros, Manejo de Maquinaria)	270
--	------------

NIÑEZ

Suplemento Alimenticio para Niños y Madres Gestantes	47 Toneladas entregadas
--	--

CONTINUAMOS EN ...

- Subsidio de Arriendo para propietarios de vivienda destruida.
- Fortalecimiento Institucional del Consejo Departamental y Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.

**INSTALACIÓN DE LA
OFICINA DEL
GOBIERNO NACIONAL
PERMANENTE EN
MOCOA - OGN**

Valor Donaciones en Efectivo - UNGRD

Cuenta Davivienda No. **021666888**

Donaciones Nacionales	\$ 10.089.155.785
Donaciones Países, Gobiernos y personas en el exterior	\$ 27.255.048.913
TOTAL	\$ 37.344.204.698

CHINA	\$ 2.854.900.000
EMIRATOS ARABES	\$ 19.690.929.675
TURQUÍA	\$ 430.250.000
BANCO CENTROAMERICANO	\$ 718.375.000
BID	\$ 569.200.000
CAF	\$ 285.765.000
KEYCOFFEE	\$ 26.378.087
MITSUBISHI	\$ 131.890.436
KEIMYUNG CARITAS (SOUTH KOREA)	\$ 12.840.994
DINAMARCA	\$ 130.434.782
USA PEEC	\$ 72.566.250
CARING FOR COLOMBIA	\$ 122.793.200
USTOA	\$ 14.820.000

BOOYOUNG HOUSING CO LTD (SOUTH KOREA)	\$ 294.796.029
LIG NEX1 CO.,LTD.	\$ 59.340.000
TAILANDIA	\$ 292.820.000
GIFU BROADCASTING	\$ 2.641.578
COREA	\$ 871.950.000
WORLD TRADE ORGANIZATION	\$ 9.460.391
HYUNDAI	\$ 293.170.000
COLOMBIANOS EN ALEMANIA	\$ 8.071.446
PERSONAS EN EL EXTERIOR	\$ 188.289.378
GIVE TO COLOMBIA	\$ 173.366.667

Asignación Recursos Donaciones

Uniformes estudiantes de Mocoa	\$ 718.017.000
Construcción Colegio de 24 aulas en Sauces II	\$ 8,500,000,000
Adquisición del Predio Sauces I - Vivienda Urbana	\$ 1,907,820,000
Escrituración del Predio Sauces I – Vivienda Urbana	\$ 9,637,000
Estudios, diseños e interventoría Predio Sauces I - Vivienda Urbana	\$ 1,455,032,040
Adquisición del predio Sauces II - Vivienda Urbana	\$ 1,185,665,880
Asistencia Humanitaria de Emergencia	\$ 569,200,000
Adecuaciones accesos y servicios públicos predio Plaza de Mercado Definitiva	\$ 1,700,000,000
Adquisición de predio para la Plaza de Mercado Definitiva	\$ 400,000,000
Pavimentación de vías urbanas	\$ 5,000,000,000
Mejoramiento de instalaciones educativas e instalación de equipos Colegio Ciudad Mocoa	\$ 290,000,000
Laboratorio de ciencia y dotación de la banda de paz del Colegio Ciudad Mocoa	\$ 122,793,200
Dotación del Centro de Desarrollo Infantil	\$ 173,366,667
Estudios y diseños para las obras de mitigación	\$ 3,000,000,000
Adquisición Predio– Vivienda Rural	\$ 1,252,773,000
Trabajos de Mitigación – Maquinaria Amarilla	\$ 6,146,452,646
TOTAL ASIGNADO	\$ 32,430,757,433
POR ASIGNAR	\$ 4,913,447,265

- *Este cuadro es un control interno de seguimiento, los valores pueden variar.*

DONANTE	DESCRIPCIÓN
Amerisur	Contenedor nevera para conservación de cadáveres
Telefónica-Movistar	15 teléfonos Nokia 3500 Negros
Bettina Spitz	7 cajas con prendas de vestir femeninas
DICORP	5 Toneladas de arroz, 582 litros de aceite de palma
Shelterbox	63-Cajas Shelterbox
Global Medic	Mapas e Imágenes de drones de alta precisión
Asecones	10 equipos portátiles de comunicación de dos vías Digital
Gobierno de Japón	30 Generadores eléctricos de 60 Hz
Eduardoño	1 planta eléctrica
Gobierno de Turquía	Medicamentos, 200 kits de aseo básico, 100 lámparas solares
Skinco Gyplac	3 kits de almacenamiento Acuaviva de 6.000L
Terpel	600 galones de ACPM para vehículos y plantas eléctricas
Fundación Éxito	Viveres para Asistencia Humanitaria
Colempaques	421 Tanques de Almacenamiento de Agua 126 canecas plásticas para las viviendas



Donación Colempaques

TOTAL DONACIONES EN ESPECIE
\$668 Millones

AVANCE PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO

RECONSTRUCCIÓN MOCOCHA

30 DE ENERO DE 2018



MINDEFENSA



Elaboración del documento CONPES 3904:

PLAN PARA LA
RECONSTRUCCIÓN
DE
MOCOA
2017 - 2022

Valor Aprobado:
\$1.2 billones

122 acciones en líneas de: infraestructura, desarrollo social, desarrollo económico e institucional, conectividad e integración regional, ordenamiento territorial.

Documento **CONPES**

3904

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

PLAN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, 2017-2022,
CONCEPTO FAVORABLE A LA NACIÓN PARA CONTRATAR UN EMPRÉSTITO EXTERNO
HASTA POR LA SUMA DE USD 30 MILLONES, O SU EQUIVALENTE EN OTRAS
MONEDAS, PARA FINANCIAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOA (FASE I), Y
DECLARACIÓN DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL PLAN MAESTRO DE
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOA (FASE I)

Departamento Nacional de Planeación
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Ministerio de Defensa Nacional

Versión aprobada

SECTOR
VIVIENDA



1.461

Total Viviendas a Construir

1.209 Viviendas Urbanas

252 Viviendas Rurales



Vivienda Urbana

Fase 1: Construcción de 300 viviendas (Los Sauces I)

\$ 22.260 millones

Avance:

- ✓ **99,2%** de avance en la etapa de estudios y diseños.
- ✓ **20,6%** de avance físico de la obra.
- ✓ El contratista de obra realizó la formulación de un Plan de Contingencia para garantizar el cumplimiento del cronograma para la ejecución del proyecto y la entrega de viviendas.

Compromisos:

- Realizar la postulación de las familias beneficiadas.
- Realizar estudio técnico y determinar la viabilidad de los recursos para la instalación de servicios públicos en el predio.- Viceministerio de Agua



Avance de construcción Fase I Vivienda Urbana – Los Sauces I

Tiempo de ejecución: 1 año
(Mayo 2017- Mayo 2018)

Vivienda Urbana

Fase 2: Construcción de 909 viviendas (Los Sauces II)

\$60.448 millones

Avance:

- ✓ Se realizó la inscripción del acta de posesión del predio en Instrumentos Públicos.
- ✓ Fue perfeccionado el Otrosí N°1 del convenio suscrito entre el FNGRD y Fonvivienda.
- ✓ Fue seleccionado el contratista para la construcción de las primeras 528 viviendas.
- ✓ Está en proceso de contratación la firma de interventoría.

Compromisos:

- Continuar con el proceso de contratación de estudios, diseños, obra e interventoría para la construcción de 381 viviendas.



Tiempo de ejecución:

1 año y 4 meses
(Febrero 2018-
Junio 2019)

Acueducto

Construcción del Sistema de Acueducto- Viceministerio de Agua

\$28.074 millones

Avance:

- ✓ **5.7%** de avance físico en estudios, diseños y obra.
- ✓ **45%** de avance físico en la instalación de redes de acueducto.
- ✓ **6.200** metros lineales instalados de redes de acueducto.
- ✓ En proceso de Consulta Previa por parte del Resguardo Indígena INGA.

Compromisos:

- Proceso de acopio de materiales e inicio de obras de la bocatoma. (1° semana de Febrero)



Avance instalación de redes de acueducto

Tiempo de ejecución: 8 meses

Alcantarillado

\$91.200 millones

Avance:

- ✓ Diseños entregados para la vigencia 2018, y ejecución para el 2019 y 2020.
- ✓ En revisión minuta del préstamo con el BID

Construcción Centro de Desarrollo Infantil barrio los Sauces I – MinVivienda

\$ 4.473 millones

Avance:

- ✓ 300 niños beneficiados.
- ✓ **2%** de avance físico de la obra.
- ✓ Se definió que los recursos donados por la organización “Give To Colombia” por valor de **\$173 millones**, serán destinados para la **dotación del CDI**.

Compromisos:

- Dar inicio al proceso de contratación para adquisición de la dotación del CDI - UNGRD.

**Fecha de
Finalización:**

Julio de 2018



SECTOR
AGRICULTURA

Vivienda Rural

Construcción de 252 viviendas

\$13.467 millones

Avance:

- ✓ Se suscribió el convenio entre FNGRD y MinAgricultura.

Compromisos:

- Definir predio para ejecución del proyecto - Alcaldía.
- Desembolso de recursos por parte del Banco Agrario a la UNGRD.



Tiempo de ejecución: 1 año y 5 meses

Vivienda Rural

**Mejoramiento de 350 viviendas -
MinAgricultura**

\$ 6.220 millones

Avance:

- ✓ La Alcaldía remitió listado con potenciales familias a ser beneficiadas.

Compromisos:

- Presentar el proyecto en la próxima comisión de vivienda para definir la disponibilidad de recursos para la vigencia 2018 de acuerdo a los “Programas Estratégicos Bolsa Nacional – Agencia Nacional de Desarrollo Rural”.

Activación Sector Agropecuario

**Reactivación Económica para 180 familias-
Alcaldía y MinAgricultura**

\$1.000 millones

Avance:

- ✓ Definición de 180 familias a ser beneficiadas con el proyecto.
- ✓ Definición de proyectos en avicultura, cítricos, plátano, aguacate, asistencia técnica y suministro de herramientas y equipos.
- ✓ Se suscribió convenio entre el FNGRD, MinAgricultura y la Alcaldía.
- ✓ El Banco Agrario realizó el desembolso de los recursos al FNGRD.
- ✓ Se encuentra en ejecución el Plan de Asistencia Técnica.

Compromisos:

- Dar inicio al proceso de contratación para suministro de elementos agrícolas y el personal de asistencia técnica– UNGRD.

Tiempo de ejecución: 6 meses

SECTOR
PROSPERIDAD SOCIAL

Vivienda Urbana

Mejoramiento de 300 viviendas-

Prosperidad Social

\$4.972 millones

Avance:

- ✓ Convenio suscrito con el operador UNOPS.
- ✓ La Alcaldía identificó a 220 familias a ser beneficiadas.
- ✓ Se definieron 3 etapas del proyecto:
 - **1era Etapa:** 120 viviendas. **Duración:** 3,5 meses.
 - **2da Etapa:** 100 viviendas. **Duración:** 3 meses.
 - **3ra Etapa:** 80 viviendas. **Duración:** 2,5 meses.

Compromisos:

- **1era Etapa:** Realizar la socialización del proyecto a la comunidad y determinar la ubicación de las familias. **Plazo:** 1era semana de Febrero de 2018.
- **2da Etapa:** Realizar la socialización del proyecto a la comunidad. **Plazo:** Febrero de 2018.
- Entregar las certificaciones de condiciones de habitabilidad de las viviendas de la segunda etapa – Alcaldía.

Construcción Plaza de Mercado Definitiva

\$8.100 millones



Avance:

- ✓ **Fase 1 Preconstrucción: UNGRD- Inversión: \$2.100 millones**
 - Componente 1 Expropiación del Predio – Inversión: \$400 millones.
 - Se realizó la inscripción del acta de posesión del predio en la Oficina de Instrumentos Públicos.
 - Se inicio el proceso de contratación de cerramiento.
 - Componente 2 Estudios y Diseños – Inversión: \$1.700 millones.
 - Se determinó que se deben adquirir 2 hectáreas y se deben realizar obras de acceso y de conexiones a servicios públicos.
- ✓ **Fase 2 Construcción: Prosperidad Social- Inversión \$6.000 millones**
 - Se suscribió convenio entre Prosperidad Social y la UNGRD.
 - Se da inicio al proceso de contratación del predio.

Compromisos:

- Revisar la infraestructura para instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales- DPS/ UNGRD.
- Determinar la fuente de financiación de la etapa de estudios y diseños, en revisión estructuración convenio con la Universidad Nacional. –UNGRD
- Entregar el listado de comerciantes a ser beneficiados – Alcaldía.

Tiempo de ejecución:

**2 años y 5 meses
(Diciembre 2017
a Marzo de 2020)**

SECTOR
EDUCACIÓN

Infraestructura Educativa

Construcción y mejoramiento de sedes educativas

\$29.000 millones

Avance:

- ✓ Construcción del Mega Colegio ubicado en el predio Saucos II – UNGRD con apoyo de Min Educación.
 - Se suscribió convenio entre UNGRD y MinEducación.
 - Más de 960 niños a beneficiar.
 - Fecha de inicio de obras: Agosto 2018.
 - Fecha de finalización: Mayo de 2019
- ✓ Construcción de 24 aulas en 3 instituciones educativas – MinEducación.
 - Se suscribió convenio con Findeter.
 - Fecha de inicio de obras: Marzo de 2018.
 - Fecha de finalización: Marzo de 2019.
- ✓ Mejoramiento de 9 sedes educativas – MinEducación
 - Se suscribió convenio con Findeter .
 - Fecha de inicio de obras: Junio de 2018.
 - Fecha de finalización: Septiembre de 2018.

Compromisos:

- Dar inicio al proceso de contratación de la consultoría de diseños, obra e interventoría, una vez se cuente con la Licencia de Urbanismo – UNGRD (Abril de 2018).

Infraestructura Educativa

Adecuación Colegio Ciudad Mocoa

\$413millones

Avance:

- ✓ Mediante convenio suscrito entre la UNGRD y el Colegio Ciudad Mocoa, se realizan las obras de adecuación de la cubierta y de la placa de la cancha y la adecuación de acceso peatonal de la sede educativa.
- ✓ **40%** de avance físico en la adecuación del colegio.
- ✓ Se realizó la formalización de la donación de Caracol TV (Yo me Llamo), por valor de \$290 millones.
- ✓ Se definió que los recursos donados por la Fundación "Caring For Colombia" por valor de **\$123 millones**, serán destinados para la **adecuación del laboratorio de ciencias naturales y de la banda de paz.**

Compromisos:

- Dar inicio al proceso de contratación para adquisición del material académico – UNGRD (Febrero de 2018).



Avance adecuación del Colegio Ciudad Mocoa

SECTOR
CULTURA

OTRAS OBRAS EDUCATIVAS

Construcción Biblioteca- MinCultura- Embajada de Japón

\$ 600 millones

Avance:

- ✓ La Embajada de Japón está encargada de la ejecución de la obra.
- ✓ MinEducación está encargado de la dotación de la Biblioteca.
- ✓ **100%** de avance físico en la adecuación y cerramiento de terrenos.
- ✓ **70%** de avance físico en la construcción.

Compromisos:

- Dar inicio a las obras de enchape de pisos, instalación de baterías de baño y colocación de cubierta.



Avance construcción biblioteca

**Fecha de
Finalización:**

Marzo de 2018

SECTOR
CANCILLERÍA

Construcción Casa Lúdica Los Sauces I

\$ 800 millones

Avance:

- ✓ Los diseños se encuentran en proceso de elaboración.

Fecha de Inicio de las obras:

Febrero de 2018

Compromisos:

- Una vez los diseños estén culminados se debe realizar el trámite para obtener la licencia de construcción.- Cancillería.

Fecha de Finalización:

Julio de 2018

Construcción de Espacio Deportivo

\$ 99 millones

Avance:

- ✓ Los diseños fueron culminados.
- ✓ En trámite perfeccionamiento del convenio suscrito entre la UNGRD, FUPAD y la Cancillería.

Fecha de Inicio de las obras:

Febrero de 2018

Compromisos:

- Realizar el trámite para obtener la licencia de construcción.- Cancillería.

Fecha de Finalización:

Abril de 2018

SECTOR
GESTIÓN DEL RIESGO

Construcción de 4 puentes peatonales

\$ 348 millones

Avance:

- ✓ **Puente Mulato:** 100% terminado.
- ✓ **Puente Villa Rosa – San Miguel:** 100% terminado.
- ✓ **Puente Dantayaco:** 100% terminado.
- ✓ **Puente San Agustín:** En proceso de contratación.

Fecha de entrega del Punto: 30 de Marzo 2018.



Pavimentación de 2.8 Kms de vías

\$5.000 millones

Avance:

- ✓ 4 tramos de vía terminados
- ✓ 1 tramo en ejecución de etapa preliminar con obras de acueducto.
- ✓ 286 metros lineales de vías pavimentadas de 2.800 metros proyectados.
- ✓ 10,7% de avance físico de las obras.

VÍAS:

- **Victoria Regia:** Intervención de 110 ml
Avance físico pavimentación: **100%**
- **Pablo VI:** Intervención de 126 ml
Avance físico pavimentación: **100%**
- **La Brigada:** Intervención de 190 ml
Avance físico obras preliminares: **22%**

Compromisos:

- Entregar diseños de 17 vías pendientes de intervención-
Alcaldía.

Tiempo de ejecución:

18 meses
(Octubre 2017 - Marzo 2019)



Tramo Victoria Regia



Tramo La Brigada

Instalación del SAT

\$1.223 millones

Avance:

- ✓ **100%** de avance en la implementación del SAT.
- ✓ 1 puesto de monitoreo instalado
- ✓ 11 sensores de río colocados
- ✓ 4 estaciones meteorológicas instaladas
- ✓ 12 sirenas instaladas

Estudios y diseños SAT

\$600 millones

Avance:

- ✓ **80%** de avance en el estudio realizado con el apoyo de la Universidad Javeriana.

SAT Comunitario

\$205 millones

Avance:

- ✓ **100%** en la implementación del SAT comunitario.
- ✓ 27.800 habitantes a ser beneficiados
- ✓ Se comienza la socialización de los Planes Comunitarios a la comunidad.



Mejoramiento Cancha el Pepino y Salón Comunal

\$360 millones

Avance:

- ✓ **100%** de avance físico del proceso de rehabilitación.
- ✓ 3.700 personas a ser beneficiadas



Tiempo de ejecución:

3 meses

(Septiembre 2017 a Diciembre 2017)

MEDIOS DE VIDA

Responsable:
UNGRD

INVERSIÓN:
\$ 351 millones

- ✓ **60 medios de vida entregados** para que las familias se reactiven económicamente y activen sus medios de subsistencia.



SUBSIDIOS DE ARRIENDO

Responsable:
UNGRD

INVERSIÓN:
\$ 10.200 millones

- 8.308** Subsidios otorgados a la fecha
- 1.485** Primera Prorroga
- 1.186** Segunda Prorroga
- 1.133** Tercera Prorroga

ASISTENCIA HUMANITARIA

- 1.218** Primera Entrega (Octubre)
- 1.060** Segunda Entrega (Noviembre)
- 972** Tercera Entrega (Diciembre)
- 1.045** Cuarta Entrega (enero)

4.295 kits de asistencia humanitaria entregados a las familias afectadas y registradas en el RUD, que reciben subsidio de arriendo



SEÑALETICA

- ✓ Definir el proyecto de señalética para identificar zonas de riesgo- Alcaldía.

SECTOR
INFRAESTRUCTURA VÍAL

4 Puentes Vehiculares

\$9.700 millones

1. Puente sobre la Quebrada San Antonio

- ✓ Fase de estudios y diseños finalizada.
- ✓ **Fecha de inicio de obras:** Febrero 2018
- ✓ **Responsable:** ANI

2. Puente sobre el río Sangoyaco – Av. Colombia


- ✓ Se realizó solicitud de concepto previo al Ministerio de Hacienda para asignación de recursos.
- ✓ **Responsable:** INVIAS
- ✓ **Estado:** **Sin Recursos**

3. Puente sobre el río Sangoyaco – Terminal

- ✓ Se realizó solicitud de concepto previo al Ministerio de Hacienda para asignación de recursos.
- ✓ **Responsable:** INVIAS
- ✓ **Estado:** **Sin Recursos**

4. Puente sobre el río Mulato

- ✓ Fase de estudios y diseños finalizada.
- ✓ **1,3%** de avance físico de la obra
- ✓ **Responsable:** INVIAS

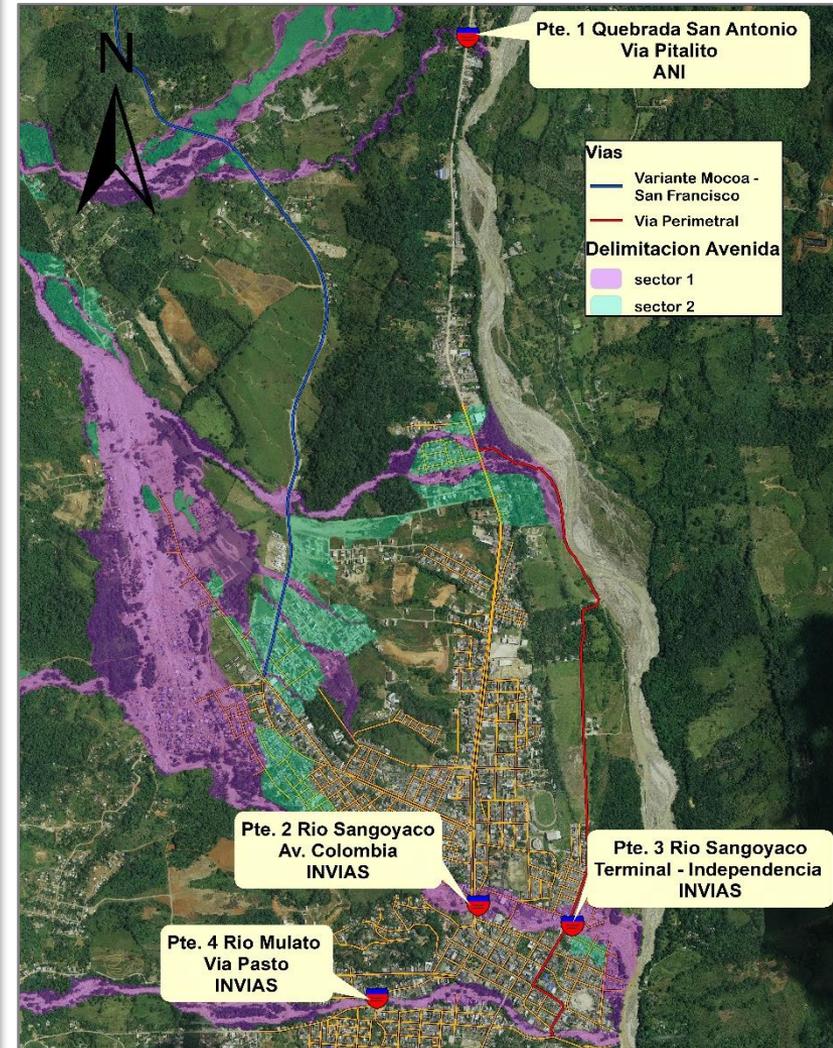

Maquinaria y Equipo

Combo de Maquinaria Amarilla

\$ 5.000 millones

Avance:

- ✓ La Alcaldía realizó priorización de maquinaria amarilla a adquirir, de la siguiente manera:
 - 1 Bulldozer
 - 2 Carrotanques
 - 1 Retroexcavadora
 - 1 Motoniveladora
 - 1 Vibrocompactador
 - 1 Vactor
- ✓ Se realizó la proyección de equipos a adquirir con recursos del FNGRD- UNGRD.

Compromisos:

- Asignación de recursos al INVIAS por valor de \$4.000 millones - MinHacienda.



SECTOR
ENERGIA

Construcción Subestación Eléctrica Definitiva

\$45.000 millones

Avance:

- ✓ **Etapa 1- Funcionamiento de operación móvil:**
 - En funcionamiento
- ✓ **Etapa 2- Restablecimiento provisional estación Junín:**
 - **30%** de avance físico, representado en limpieza de equipos, reconstrucción de la sala de control y remplazo e instalación de tableros.
 - **Fecha terminación:** Mayo de 2018.
- ✓ **Etapa 3 -Construcción de la nueva subestación “RENACER”:**
 - **5%** de avance físico
 - En proceso etapa de prediseño.
 - **Fecha de terminación:** Marzo de 2020.



Compromisos:

- Realizar el cronograma de ejecución del proyecto- MinMinas.

Subsidios al Consumo de Energía Eléctrica \$462 millones

Avance:

- ✓ Se otorgará por un periodo de **6 meses** subsidios a los damnificados de estratos 1, 2 y 3 registrados en el RUD y que figuren como usuarios de la Empresa de Energía de Putumayo (Según Resolución N° 41530 de Dic.de 2017)

SECTOR
TELECOMUNICACIONES

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

\$ 7.100 millones

Avance:

- ✓ Se realizó la entrega de:
 - **3 licencias** de emisoras comunitarias.
 - **226 becas** en TI- competencias técnico laborales
 - **4.500 computadores** para educar
- ✓ Se apoyo en la creación de **318 MiPymes** conformadas en TIC.
- ✓ Se instalaron **4 zonas WIFI**.
- ✓ Se identificaron **11.591 estudiantes** a ser beneficiados de **37 sedes educativas**.

Compromisos:

- **Instalación de 2 zonas WIFI:** Se realizará la entrega en el mes de marzo de 2018.
- **Despliegue de televisión digital terrestre:** Realizar la entrega de 2.500 decodificadores de TDT. **Plazo: Febrero de 2018.**
- **Instalación de punto Vive Digital:** Realizar la instalación de un punto en el Instituto Tecnológico del Putumayo. **Plazo: Junio de 2018.**



SECTOR
SALUD

Construcción y Dotación Hospital José María Hernández

\$ 33.826 millones

Avance:

✓ **33,76%** de avance físico en la obra.

**Fecha de
Finalización:**

Marzo de 2020



Compromisos:

- Definir los proyectos biomédicos a desarrollar- MinSalud.

SECTOR
AMBIENTE

Avance:

- ✓ Mesa técnica ambiental en funcionamiento.
- ✓ Corpoamazonia presentó, dentro del marco de la mesa técnica ambiental, la propuesta de la etapa de estudios de ejes ambientales y del acotamiento de rondas hídricas, avaluados en \$ 3.000 millones, **los cuales serán financiados con donaciones.**
- ✓ Se presentó al DNP el proyecto de obras de mitigación y reducción del riesgo, avaluado en \$130 mil millones para revisión.
- ✓ Durante la semana del 15 al 18 de enero el Ministro de Ambiente realizó visita a las zonas afectadas en Mocoa para evaluar y verificar necesidades.



Estudios de Microzonificación Sísmica

\$ 400 millones

Avance:

- ✓ Se entregaron los estudios de amenaza por movimientos en masa y flujo a escala 1:25000, en las cuencas de las quebradas Taruca, San Antonio y el Carmen, y los ríos Sangoyaco y Mulato.
- ✓ Se entregaron los estudios de amenaza por movimientos en masa y flujo a escala 1:5000 para áreas urbanas y suburbanas.
- ✓ **80%** de avance en microzonificación sísmica, exposición y riesgo sísmico para el área urbana y suburbana.



SECTOR
PLANEACIÓN

Revisión y ajuste del PBOT + estudios de riesgos

PROGRAMA
**POT
MODERNOS**

Valor:

\$ 4.886* millones

* Incluye estudios de riesgos

Tiempo de
ejecución:

9 meses

Actividades adicionales del DNP

- ✓ **Elaboración del documento CONPES 3904:**

PLAN PARA LA
RECONSTRUCCIÓN
DE
MOCOYA
2017 - 2022

**Valor estimado: \$1.2
billones**

**122 acciones (infraestructura,
desarrollo social, económico
e institucional, conectividad
e integración regional,
ordenamiento territorial)**

- ✓ **Apoyo permanente a la Gerencia**
- ✓ **Apoyo para la actualización del Plan de
Desarrollo Municipal**

- ✓ **11 de diciembre de 2017:** Presentación del Enlace Territorial ante el Concejo Municipal y el gabinete de la Alcaldía (Consejo de Gobierno de Mocoa).
- ✓ **19 de diciembre de 2017:** visita a centros nucleados con INYPSA.
- ✓ **5 de enero a la fecha:** equipo de riesgos en campo recolectando información y visitando las principales fuentes hídricas.
- ✓ **11 de enero de 2018:** socialización de la estrategia de participación con la Alcaldía, ASOJUNTAS e INYPSA.



- ✓ **Otras actividades en curso:**
 - Identificación, recolección y clasificación de la información disponible.
 - Análisis de información básica de riesgos.
 - Consecución y adecuación de la sede en Mocoa.
 - Reuniones semanales con la Alcaldía y Corpoamazonia.

SECTOR
COMERCIO

Recuperación del comercio y la actividad productiva

Reactivación de 170 Negocios Formales:

Valor:

\$ 4.250 millones

Primera Fase: 6 a 8 meses
 (Julio 2017 a febrero de 2018)
 Segunda Fase: 6 a 8 meses
 (Noviembre 2017 a junio de 2018)

Tiempo de ejecución:

Avance:

- ✓ \$3.000 Millones en ejecución para 120 Negocios iniciales. A la fecha solo faltan 20 negocios por terminar entrega de apoyos en equipos, maquinarias e inventario.
- ✓ Está en proceso de contratación un cuarto proyecto para reactivación de 50 negocios adicionales.



Comunidades indígenas:

- ✓ En ejecución: Fortalecimiento productivo y comercial de **5 cabildos. Inversión \$250 Millones.**
- ✓ Encuentro regional de Economías Propias MOCOA – Feria de Negocios del 09 al 11 de Nov/17.
 Comunidad Simuyaco - \$ 20 millones
- ✓ Turismo: Ingresos confirmados por valor de \$60 millones, beneficiando a 150 personas.

Cofinanciación: Bancoldex - FNG

- ✓ Línea de Crédito Bancoldex: **Desembolsos por \$ 16.638 Millones** a intermediarios financieros, representados en 357 operaciones y **más de 3.060 beneficiarios.**
- ✓ Garantías – FNG: \$11.003 millones en 581 créditos garantizados.

Competitividad Sector Turismo

Convocatoria Nacional para Planes de Negocio de Turismo Comunitario:

- ✓ Se ejecutaran los siguientes proyectos a través de FONTUR:
 - **Puerto Caicedo:** “Diseño de producto turístico en naturaleza y cultura de la comunidad indígena Awa”.
 - **Mocoa:** “Plan de comercialización para la puesta de mercadeo turismo de naturaleza, con énfasis en turismo de aventura y turismo científico para el diseño de producto turístico en el eje ambiental Mocoa – Villagarzón”.

Capacitación y Formalización para Prestadores de Servicios Turísticos:

- ✓ Dos formadores nativos continúan impartiendo capacitaciones en bilingüismo a los prestadores turísticos registrados.
- ✓ Se han realizado 2 talleres de “Implementación del Diseño de Producto Turístico” tanto en Mocoa como en Valle del Sibundoy.
- ✓ Definición de participación de la líder de la base empresarial de Putumayo y un prestador turístico en el “Evento Colombia Empresarial 2025”.

Promoción del Destino a Nivel Departamental:

- ✓ Se dispone de recursos por valor de **\$350 millones** para promoción del destino a nivel departamental a través del proyecto ‘Destinos Turísticos en Emergencia’.
